

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
 DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No. 2508 COL. 10 DE MAYO
 C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 6 1 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: 1 10 2016

FECHA DEL REPORTE
 FECHA: 16 8 2016

2016
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	41%	12,367,754.30	4510	27%	LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN UNA PRIMERA FASE DE OBRA NEGRA SE ESTÁ CONSTRUYENDO CONFORME LO PROGRAMADO. LA DIFERENCIA DEL AVANCE FÍSICO CONTRA LO EJERCIDO ES POR LA AMORTIZACIÓN DEL 40% DEL ANTIGÜO.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN
 CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRÓNICO: jgarcia@itc.mx
 TEL 10 DÍGITOS: 514271200 ext. 190

NO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 DR. JOSÉ EVERETT
 FIRMA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO


DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)


DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.



**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**




Informe de obra 16 Agosto 2016

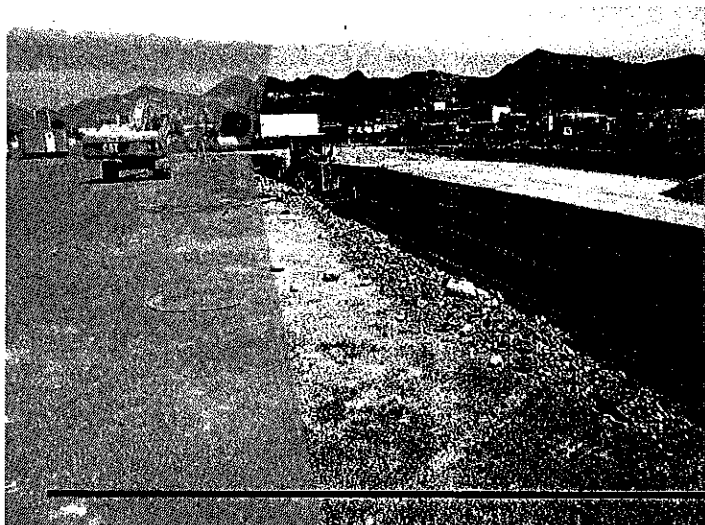

1 | Obra exterior

Trabajos de compactación y
terraplén en el área de
implantación.

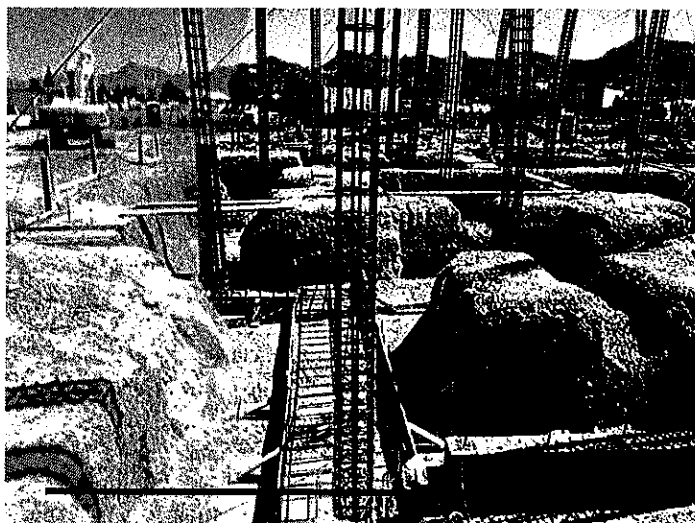

2 | Obra exterior

Excavación, e Implantación
de estructuras de acero
para la cimentación.



RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	2948
FECHA:	16/1/2016 12:37:32
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: SEP/INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: SEP210905778

Domicilio:	AVENIDA TECNOLÓGICO No. 2909
Colonia:	10 DE MAYO
C.P.:	31310
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LA OBRA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, OBRAS Y REDES EXTERIORES, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	9,824,137.93	9,824,137.93

Importe total con letra
ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 9,824,137.93
I.V.A.: 1,571,862.07
TOTAL: 11,396,000.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	E8791F42-258E-457E-B004-5942215FACEE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 16 2016 - 13:37:39

Sello digital del CFDI

TSadnEloaeh5VpyMa2b3HDZ9FsXUvRMZ3jtyMk+RFK2DjaIF9PkRsvjuV9FIH0h+o56k64IPdZelf+st4hmzr8
wxw+FzY2Zi5YBnQ8ZHcoGel0dc2uEc9PrI/GP1NH7wzSq5v9QrE7qQd4JtWoA0wVs1/tI+FX+wVY3qQVvGrY=

Sello del SAT

FIPmzT3VaVrkj6XHAzCcWifxKPN7CTyxQIriGoZn9ZG49hXpJtOGU+LFnuzbmBoDBdUglphSdlgEVP
aFs29muK4CIEd8NGI3UU8ng6PB09tLGzcUjJp5fE70v5qkftnXlghTCrIw4RxWBcneL2LQOLOABRe
ulaEnNg150M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]E8791F42-258E-457E-B004-5942215FACEE|2016-01-16T13:37:39|TSadnEloaeh5VpyMa
2b3HDZ9FsXUvRMZ3jtyMk+RFK2DjaIF9PkRsvjuV9FIH0h+o56k64IPdZelf+st4hmzr8wxw+FzY2Zi5
YBnQ8ZHcoGel0dc2uEc9PrI/GP1NH7wzSq5v9QrE7qQd4JtWoA0wVs1/tI+FX+wVY3qQVvGrY=|0000
1000000202864883|]

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

RAHECSA

Concreto con fuerza

- TEC -

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3577
FECHA:	1/7/2016 10:03:34
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	



Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC,CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 1-E (UNO-E) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$1,549,931.09 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$619,972.44	929,958.65	929,958.65

Importe total con letra
UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
CHEQUE

SUBTOTAL:	929,958.65
I.V.A.:	148,793.38
TOTAL:	1,078,752.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	A6950F11-E68C-430E-8CB9-2B3E555C4373
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2016 - 11:04:10

Sello digital del CFDI

BHkum5ay1xztN21Eb2CAI7leGmZaLYsE|1nStRcCMS8WPIIVdG+LFWUsVbt9pRrqY+G+hcoS3MPvPbyC8nCpeS
NbM3Zppi1qnGGQ8+3BXPfXNEnb8v3/u+PZ7RdHI7wETRdCQTKiEdJsdc+MQv0fk7h4B7fNUSHQY3r4DK4Og4U=

Sello del SAT

VzI2gBhv15n2SNS1atMcSmjbxoTKHpzaotAnaV+GmRDM/JsgGtBDidoAaRUwCsiwCD/nzztFfKDGNmRl
LBSXE8gTb98XaKwCnrUXgieutBd48eOTHTeex4TL3GBuVKzaMhXL++SeZHLlgldO22eXhryv4shs/49j
Co1ihAssuU=


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A6950F11-E68C-430E-8CB9-2B3E555C4373|2016-07-01T11:04:10|BHkum5ay1xztN21Eb
2CAI7leGmZaLYsE|1nStRcCMS8WPIIVdG+LFWUsVbt9pRrqY+G+hcoS3MPvPbyC8nCpeSNbM3Zppi1qn

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE		2016				
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No. 2909 COL. 19 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.		FECHA DE INICIO: 8 1 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 1 10 2016		FECHA: 13 9 2016 DÍA MES AÑO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	49%	13,880,888.88		4510	38%	ACTUALMENTE SE ESTÁ DESPLANTANDO EL TERCER NIVEL DE AMBAS TORRES. SE ESTÁ PREPARANDO CUBIERTA PARA COLAR LOSA DE ACOTEA Y ESTA POR TERMINAR EL ARMADO DE DALLAS Y LOSAS, LAS COLUMNAS DE SOPORTE ESTÁN YA TODAS TERMINADAS.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: ARG. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CORREO ELECTRÓNICO: sgonzalez@ich.edu.mx TEL. 10 DÍGITOS: 6142012000 ext. 180		NOMBRE: DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA FIRMA:  VICE DIRECTOR DEL INSTITUTO	
---	--	--	--

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS
AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)


DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.



**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**



Informe de obra 13 Septiembre 2016

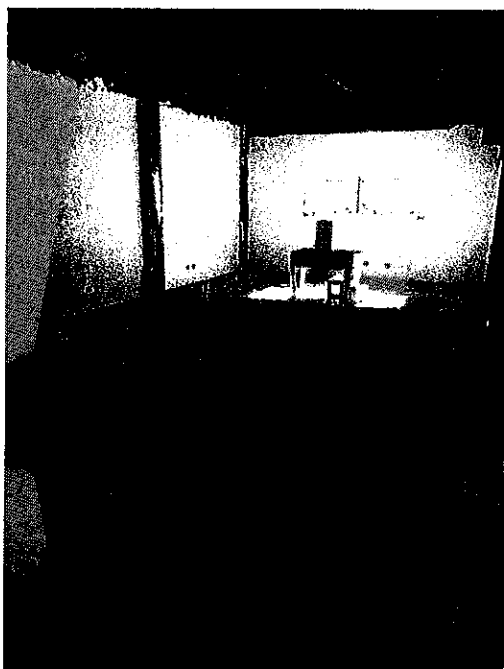

1 | vista interior

Trabajos interiores de
firmes de primer nivel
terminados.

2 | Obra interior

Instalación de tubería
hidráulica de agua y
drenaje.





Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3596
FECHA:	4/7/2016 15:25:48
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:
C.P.:	06010	Ciudad: DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$1,207,664.62 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$483,065.85	724,598.77	724,598.77

Importe total con letra
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
CHEQUE

SUBTOTAL:	724,598.77
I.V.A.:	115,935.80
TOTAL:	840,534.57



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	AD079CAD-72F9-42E4-B8C1-D1FC247E48F3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 4 2016 - 16:25:50

Sello digital del CFDI

0OnJJO15wQt0EZdl1kv/8MpvWjRM72XN65q+F6HQXeoNXo7cYxJCxNcywfe7SyOp71mDdsBymax2sdJHp8Opv7
RrjKCTy1Bld2swHgrGSdCyO+7zlgfUyhEkDVsq8sRxDH1S1WfGkev9FST2HNcq/BrXN9WCXGPU61Mdxfg1b4=

Sello del SAT

Jf/CA2zP8JtwYvi2BM+hk0D07KHL1vB3cfYxAbBs4RdaxKik9lPElr/cD33AkOs5S1HZzeTY23kJh7
fZWaOGKICNlKXIIAEBSHpVkyjPSzNO5yf50riC53fOsegt01QS3JaN+S1vsQsdx/cnSguaN96HM0Gfa
3Y552pQdHUI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AD079CAD-72F9-42E4-B8C1-D1FC247E48F3|2016-07-04T16:25:50|0OnJJO15wQt0EZdl1kv/8MpvWjRM72XN65q+F6HQXeoNXo7cYxJCxNcywfe7SyOp71mDdsBymax2sdJHp8Opv7RrjKCTy1Bld

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3595
FECHA:	4/7/2016 15:24:06
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287 LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	Teléfono:	
Colonia:	COL.CENTRO	Ciudad:	DELEGACION CUAUHEMOC, CD DE MEXICO
C.P.:	06010		

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 2-A (DOS A) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. UCTURA TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. UCTURA TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACIÓN DE \$249,668.94 MENOS UNA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE \$99,867.58	149,801.36	149,801.36

Importe total con letra
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
CHEQUE

SUBTOTAL:	149,801.36
I.V.A.:	23,968.22
TOTAL:	173,769.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	7781B311-63B1-4282-8A5A-D638E621F880
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202854883
Fecha y hora de certificación:	Julio 4 2016 - 16:24:09

Sello digital del CFDI

X2RBpvjk4+oBMwmKzof4TCybTtIICPzW1zZXc6WYUra+N49udHOTs2x/sPYEUIKEyJHLpMUuMnw71CqI+M6M
HwLkillrZIMPI3Z/Tq3QfgcUXaHv9TODRHRJO9N8tRGhanpYFUOL9aMu1Hmb/43WNWndRHPAxuLaJ24GP6M=

Sello del SAT

PpS2FdFV/g4HRDf0EN6Wpb+VClzzNxqAOZstMEoHG+Hur4eoUT11tM/z4S1dK2F1Av1WvluDacXzbZ
Dr5biGxL7r7+Ztp783SrLXAnEEKLCHX5kOG/ZOL1+uyEfhjmyrrojZGgZoE7YdI4KQC984cDI6A3iCe
uU+ObbUrrjKM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7781B311-63B1-4282-8A5A-D638E621F880|2016-07-04T16:24:09|X2RBpvjk4+oBMwmKz
of4TCybTtIICPzW1zZXc6WYUra+N49udHOTs2x/sPYEUIKEyJHLpMUuMnw71CqI+M6MHwLkillrZIM

- TEC -

RAHECSA
Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3575
FECHA:	1/7/2016 09:53:47
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$117,174.42 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$46,869.77	70,304.65	70,304.65

Importe total con letra
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
CHEQUE

SUBTOTAL: 70,304.65
I.V.A.: 11,248.74
TOTAL: 81,553.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	8DD3101B-EA72-43A8-A931-29FC9BC1E803
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2016 - 10:53:51

Sello digital del CFDI
hsdu6rjYw3dzhFu9eGmjdxbZxWwefvqdJZDTFFpGBZx7kDLTq58gfUwGoaHZDDFYtXGtKbeS9r/CGRwJVA9C
Bbxrj4JSoeXhsx1ZlrsvielDWWITzo9dapqzAS3Y/a6w5lp73DogQdVNO1FMQowpO+Zc5fpWngpiO5IbGx2Nc=

Sello del SAT
JQPS+wsyaFGW2y2LwkOjY047Ckr1y+Pq88UA5WEJI43KEI4szDrM8KROquiOENR7MLIotY5OW7e4
9MpVZIOD+FGD2wmO0rxRhJyxb9WG3yXKg42pR2k27FWI8wPfcavdlQhix7BuAhm4W5JmiHdFLJrfdi
bhvauaw1J4A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]8DD3101B-EA72-43A8-A931-29FC9BC1E803|2016-07-01T10:53:51|hsdu6rjYw3dzhFu9e
GmjdxbZxWwefvqdJZDTFFpGBZx7kDLTq58gfUwGoaHZDDFYtXGtKbeS9r/CGRwJVA9Cbxri4JSoeX

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3576
FECHA:	1/7/2016 09:57:47
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287 LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	Teléfono:	
Colonia:	COL.CENTRO	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO
C.P.:	06010		

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 1-A (UNO-A) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$158,447.22 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$63,378.89	95,068.33	95,068.33

Importe total con letra
CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
CHEQUE

SUBTOTAL:	95,068.33
I.V.A.:	15,210.93
TOTAL:	110,279.26



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	1C188EB9-320B-462F-90D0-CFC31383031E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2016 - 10:57:49

Sello digital del CFDI

EVxLXrYcjskr43r11OeA+PfES18J5/QAu9CAOjVR9leg/Hjnl+7c6hBkrjdCUTg5uoLxDH+O6BhPJA7mMNQ/g7
4+uNjx9RBMJSb86RCapV1/xcQpsviedFKo6XAoyrjX4BLxos85XB+ddCRH+RINTtg900mNMfDuRXsJEZbFnE4=

Sello del SAT

mm36DOhp5vD6wofDPqGOQVOK/9hgHZtdCEKJ/QBEGov/SHNuW4OGhV5WDJhJbGH1qTKopxHz5KWm05/
x6di/kUkKhSnUIMeaOOWIM+3X/14IsfVPTY4XKILRp4fIC3ayFx2AwvslTiKlrgdJneQ7S+zt5nRcW
BSr49/XEnWM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C188EB9-320B-462F-90D0-CFC31383031E|2016-07-01T10:57:49|EVxLXrYcjskr43r11
OeA+PfES18J5/QAu9CAOjVR9leg/Hjnl+7c6hBkrjdCUTg5uoLxDH+O6BhPJA7mMNQ/g74+uNjx9RBMJ



INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO	AV. TECNOLÓGICO No. 2809 COL. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE INICIO		
6	1	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN		
1	10	2016
DÍA	MES	AÑO

CALENDARIO DE OBRA	SUMA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

FECHA	10	10	2016
	DÍA	MES	AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

[illegible]

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN

CARGO : JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: clgonzalez@fich.edu.mx

TEL 10 DIGITOS :
6142012000 ext. 190

NOMBRE :

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

FIRMA

FIRMA

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DIRECCIÓN
AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LOS CIUDADANOS)
OTROS (ESPECIFICAR)





**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**



Informe de obra 10 Octubre 2016



1 | vista interior

Trabajos interiores
hidráulicos y muros
exteriores



2 | Obra interior

Trabajos de enyesado en
muros interiores



RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3878
FECHA:	21/9/2016 09:56:44
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287 LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 int. No. PISO 2	Teléfono:	
Colonia:	COL.CENTRO	Cludad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO
C.P.:	06010		

OBSERVACIONES	NETO A RECIBIR DE ESTA FACTURA TOTAL DE LA FACTURA: \$253,018.78
---------------	---

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AVE. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$363,532.74 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$145,413.10	218,119.64	218,119.64

Importe total con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS 78/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

SUBTOTAL:	218,119.64
I.V.A.:	34,899.14
TOTAL:	253,018.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	AAEF9378-CODF-43DB-B9C0-F94812AEDC98
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 21 2016 - 10:56:47

Sello digital del CFDI

uGtp/yjuB5Imulh3EjVVO3DR4mWgLP/eqrGLYKDC0Is6RBAJfg8tDvbXJL9BQAVG4XZfSI5BQMPTKsAKOL38aOlhfjTAKncAR49mLVsw4rPCqXVvPyyj7aczJgKhYAWhjXk2QdxgHQqHdEvD/FsQIHIXmprgFs1Km9KeyfDWA=

Sello del SAT

RmOLSV6cUslv9W0lzKym5+/ZsPKlkagc8EpURsmc68K26veKypVtArpKSqWZcHwCQ+va4XAY143gImpMeqyWJrS1Vlntv2eSZK3P5LUC+EDhHWy3hCtYECuPbS/JgNXCXqH+vT20UF6cm07xndVv8E5eycCqKwUUVryN8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAEF9378-CODF-43DB-B9C0-F94812AEDC98|2016-09-21T10:56:47|uGtp/yjuB5Imulh3EjVVO3DR4mWgLP/eqrGLYKDC0Is6RBAJfg8tDvbXJL9BQAVG4XZfSI5BQMPTKsAKOL38aOlhfjTAKncAR49mLVsw4rPCqXVvPyyj7aczJgKhYAWhjXk2QdxgHQqHdEvD/FsQIHIXmprgFs1Km9KeyfDWA=|00001000000202864883||



INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE INFRAESTRUCTURA
Y EDUCACIÓN
REGIMEN GENERAL

P.P.

[Handwritten signature]

2016
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

9	11	2016
DIA	MES	ANO

FECHA DE INICIO		
8	1	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN		
9	1	2017
DÍA	MES	AÑO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

[illegible]

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARO CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON

CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

CONSEJO ELECTRONICO
circon@alcatel-tech.edu.mx

TEL 10 DÍGITOS:

NOMBRE :

VO SO DIRECTOR DEL INSTITUTO

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

FIRMA

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PACE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.



SEI O FICHA

LEO OFICIALES

~~SECRET~~
~~SECRET~~

WISDOM JOURNAL OF THE
1-801-788-1110/1-801-788-777

DE CHILAHIA


AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)



**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**



Informe de obra 09 Noviembre 2016

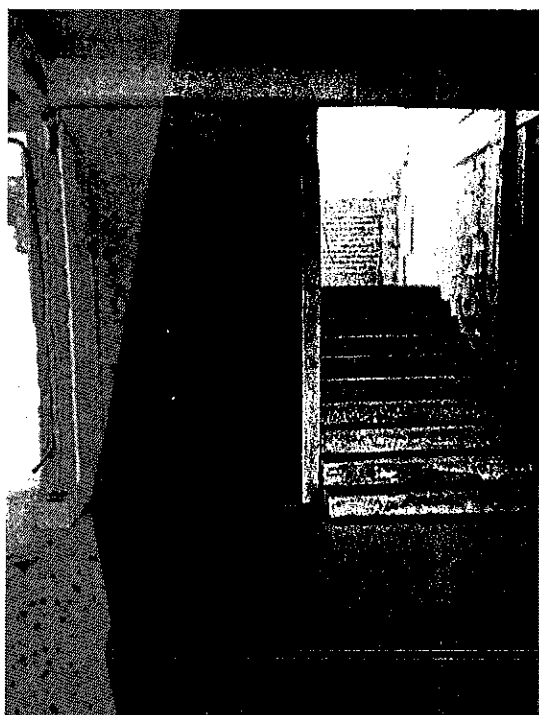

1 | vista interior

Trabajos interiores de
escaleras terminados en la
Ala "A" y Ala "B".



2 | vista interior

Trabajos interiores de obra
civil terminado, listo para
recibir acabados interiores
Ala "B"



RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3877
FECHA:	21/9/2016 09:50:59
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:
C.P.:	06010	Ciudad:
		DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	NETO A RECIBIR DE ESTA FACTURA: TOTAL DE LA FACTURA: \$229,836.03
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 3A (TRES EXCEDENTE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$330,224.18 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$132,089.67	198,134.51	198,134.51

Importe total con letra
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

SUBTOTAL:	198,134.51
I.V.A.:	31,701.52
TOTAL:	229,836.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	0379A425-C630-493E-BA1D-40E306F1E8EA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Sep 21 2016 - 10:51:04



INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA, EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

Sello digital del CFDI

pITZqp1CCamvvlAK4EhzyJluN7ffYdv+o4nXpW6uFv50MYOg/b5yAfle5uc/KCY4TrxBa6p3FCaDDvbZpQXfA
ERchU6R2hu0nTVy4bSpbNUs8lcBOON2P6wU0phvrFmMxG7Vv10v5Skq/8wacXPHVU1rPx4wYAtw2vFjExNw=

Sello del SAT

L8PmfDl8glTzienw7SILHwgW//GQl/jvX110FZahJgyGB/pKag58dbamDfsu.9YmVnVlCo/x/TzUOMio
ustaTQ/oaR9ko6v5y0qZfN8W6xL+pPMmbmQlRY/mfvbK1oB1vCvXY7/p7kfwTcqlDpUWk6R0dH3Fk331
F06+Drq0p34=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0379A425-C630-493E-BA1D-40E306F1E8EA|2016-09-21T10:51:04|pITZqp1CCamvvlAK4
EhzyJluN7ffYdv+o4nXpW6uFv50MYOg/b5yAfle5uc/KCY4TrxBa6p3FCaDDvbZpQXfAERchU6R2hu0
nTVy4bSpbNUs8lcBOON2P6wU0phvrFmMxG7Vv10v5Skq/8wacXPHVU1rPx4wYAtw2vFjExNw=|0000
1000000202864883||

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGUN CONTRATO

2016
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARIA DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E
 INFRAESTRUCTURA FISICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DEL REPORTE: 12 DIA 12 MES 2016 AÑO

FECHA DE INICIO: 6 DIA 1 MES 2016 AÑO

FECHA DE TERMINACION: 9 DIA 1 MES 2017 AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No.2909 COL. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	47.21% \$ 14,165,743.87		4810	53%	A LA FECHA LA ESTRUCTURA DE AMBAS TORRES SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN PROCESO DE OBRA BLANCA CON YESOS Y ENJARRES.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN
 SELLO OFICIAL

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ARO. CARMEN LAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN

NOMBRE: ARO. CARMEN LAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN

CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: gonzalez@itcch.edu.mx

TEL 10 DIGITOS: 6142012000 ext. 180

NOMBRE: DR. JOSE RIVERA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAG (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua


Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de Educación a Distancia.



Informe de obra 12 Diciembre 2016

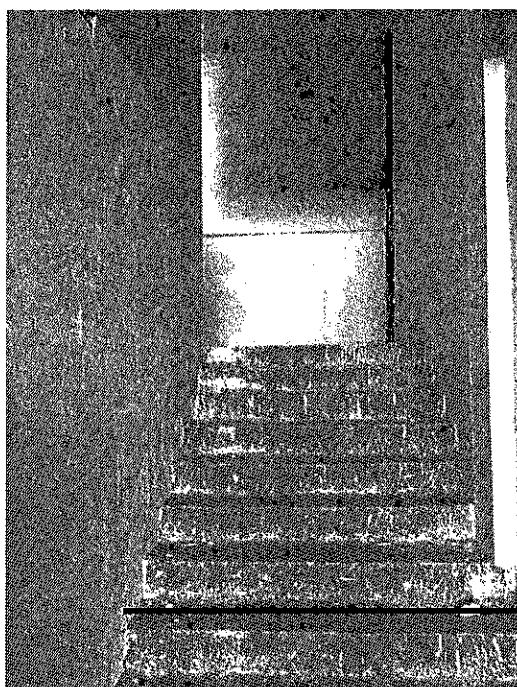

1 | vista interior
Trabajos interiores de enyesado en
escaleras terminados en la Ala "A" y
Ala "B".

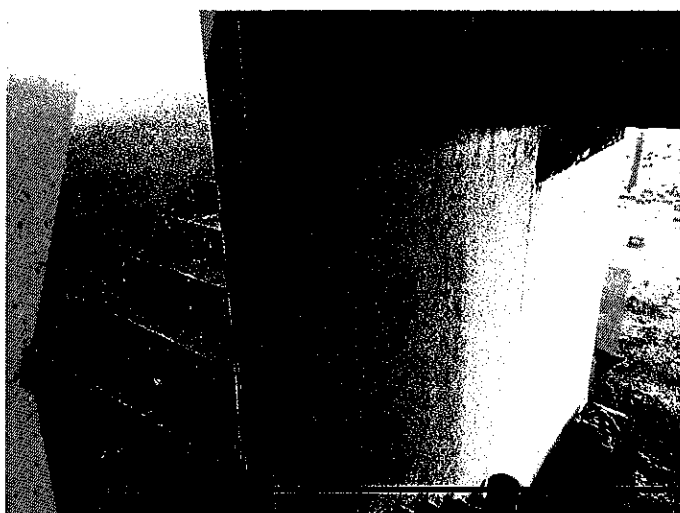

2 | vista interior
Trabajos interiores firmes de
concreto terminado, listos para
recibir cerámicas



2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL**

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO		
DIA	MES	ANO
6	1	2016

FECHA DE TERMINACIÓN	9	1	2017
-------------------------	---	---	------

[illegible]

UNCLASSIFIED

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

UK. JOSE KIVISSA-MELIA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua

Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de Educación a Distancia.



Informe de obra 06 Enero 2017

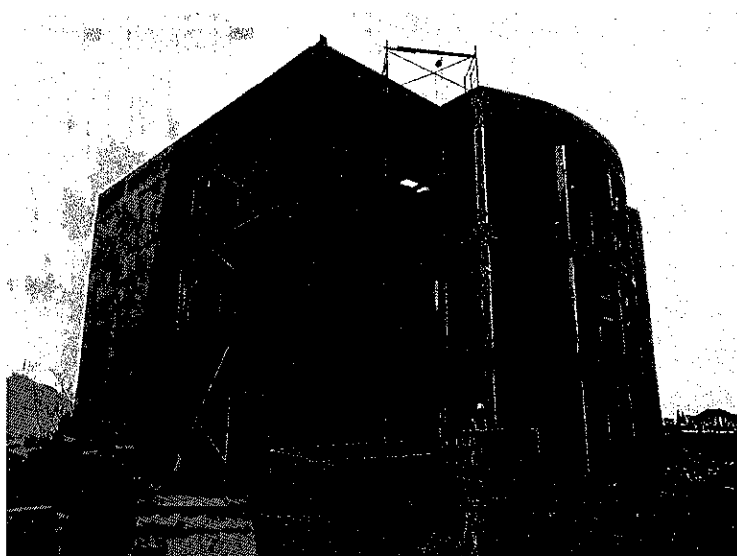

1 | vista exterior

Trabajos exteriores de enjarre en la
Ala "A".



2 | vista exterior

Trabajos exteriores de enjarre en
la Ala "B".



Av. Tecnológico N° 2909, Col. 10 de Mayo C.P. 31310, Chihuahua, Chih., México
Tel. (614) 201-2000 Fax (614) 413-5187 Apartado Postal 2-1549
Correo Electrónico: director@itchihuahua.edu.mx www.itchihuahua.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA		FECHA DEL REPORTE		2016					
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA		SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA					
AV. TECNOLÓGICO No. 2909 COL. 10 DE MAYO		FECHA DE INICIO		FECHA		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA					
C.P. 31510 CHIHUAHUA, CHIH.		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA					
						INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA					
PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO		RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA 2014 2015	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	48.76%	\$ 14,528,319.89		4510	55%	LA CONSTRUCTORA PARO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA. ESTO DEBIDO AL CAMBIO DE GOBIERNO. ESTAMOS A LA ESPERA DE REANUDAR LOS TRABAJOS ESTA SEMANA. SE TIENE UN RETRASO DE OBRA DE 60 DIAS.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARACÓN

CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO: gonzalezja@ichihua.edu.mx

TEL 10 DÍGITOS: 514201200 ext. 190

FIRMA: [Firma]

VOBO. DIRECTOR DEL INSTITUTO: [Firma]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)

PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

PAGE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**



Informe de obra 12 Febrero 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4177
FECHA:	17/1/2017 09:34:42
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALÉS SA DE CV	CESAREO SANTOS 110, 6387
	LA CUESTA
RMA970101-417	32550, JUÁREZ, CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32550, JUÁREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA


Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	Teléfono:	
Colonia:	COL.CENTRO	Ciudad:	DELEGACION CUAUJTEMOC, CD DE MEXICO
C.P.:	06010		

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA; CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$93,054.57 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$37,221.83.	55,832.74	55,832.74

Importe total con letra
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL:	55,832.74
I.V.A.:	8,933.24
TOTAL:	64,765.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	5583274
Folio fiscal:	4177
Nombre-Serie del Certificado del SAT:	5583274-4177
Fecha y hora de certificación:	17/01/2017 09:34:42

Sello digital del CFDI

JPmlHm7pw6a+yRS2thwptsQPdP0th9LYs+dn1LrJf6erqASllo+P9rdLQZJbWWS9unBnh3M2SXSGVw3Vlm
mZ+hd9erMpYIDPsUb2wxPiYtG/rISJ07IJgo92/4TUGKU1FpDTrArfQd8HPZUO+IFnzcA8JHOV6dCO7bCdTs=

Sello del SAT

qISKl8+5fPD/UT9GXWe2WthA4iyMHMQnFAJUE9KIsEqNcWVldt7+oKegnH5hLwSYR3jwkCex7seGxF
55XODgLR2+VQj5WCQz5HCF56G+eVO5e6Gm+hs2f6fNGmG7c1pgUgh8vuSzMdadh56VSjB8fChZAAuar
wOwOdoFrAlpyGC5bFSxp5bjlXatf79nWypqExeQfjkDHahig48rXP0bfw4-4VJyuVc878OVxRd/WiHp
lbfXeLjsbPOLLBGqPYUj28UR6r7ZfNSi8QsRuXNWv7EYqK+rDYSR3YKQX69/tqz7oqV6Xta6DXeytn
EYWHlpe2rzYMHlQnWnZqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4178
FECHA:	17/1/2017 09:49:21
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$160,513.96 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$64,205.58.	96,308.38	96,308.38

Importe total con letra
CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 72/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL:	96,308.38
I.V.A.:	15,409.34
TOTAL:	111,717.72



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	SC705CS4-EC59-49C6-AF5F-45194BCAA014
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 17 2017 - 10:49:26

Sello digital del CFDI

ZfJkQQRGfEILHxBrcUS0hBXTUIno4bK2+YDK5gFD3ptXlwbPR9imt/wuQspfRzGPfB3EuaT51GDZCNmQ2fn
VhcePR5+Hc099D54rME5IEmqtdvpfExicldKd26fTwSGvuH86G03jzixbfyHRTLUCEfFm6qYfzi0i2cDOJkc=

Sello del SAT

re84mdT13OTfEXmji6NEkk+Hz8jv4GatsHzbfDc77On7rLiQ/nSa58LW2n5qMLfN0x0d1PjXfTwEcYr
uAW50u66SAkTYTuZ7uzyY0km5SbFQ5PIjwhhNACrPBMIkgtCGVgSOSTnesd5QHX/zY6aE3xtGKtoft
6+TPw7UqZSRrWja78I3TseNxxnUAD/Eiu6ITQXEY:FwZ3NxUwx8VUaqKpHgLr6qvstHc5IXH6gCaPj
d1FZ2IL9xKULSP5VfN10X7OyjiHm9qpWwivkbTgLiX02ZluWhdYHfokt31Hf9UPrvUuWbjLxsfmPW
J5X5ucUbcMyTmZvr0RqnTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4179
FECHA:	17/1/2017 09:58:16
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287 LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2
Colonia:	COL.CENTRO
C.P.:	06010
Teléfono:	
Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$844,960.43 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$337,984.17.	506,976.26	506,976.26

Importe total con letra
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL: 506,976.26
I.V.A.: 81,116.20
TOTAL: 588,092.46



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203326703
Folio fiscal:	7C33271A-B169-478A-9B4B-1596786D11F1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 17 2017 - 10:58:22

Sello digital del CFDI

BWtdnIZLX5qLD+RO5wm706QISC7wQ1afABjeSSLPyTTJOhHrmFd6ociuqq6+oBIsDZGEAu9EEzXjol9D+nVsn
bosRTlIgzXFEYw6yIcBogLNFIs+3CthEhCcPizhwJfzS/yYqPgVH1zavLoxozgWgHs74MhxJVNNU67do53Uc=

Sello del SAT

t+PG+G1WzlpMFDajp3IbNHXYPGRpjfwKold8h8YwArncEU0Uwd2gXV0bhwuJ2p2XLP07823b9HusJb
TL9gCSm5Ah5BQkbG/OGH4Kp9tbSn4xCVPm05HDJNGULqtstaDyQKIFZICQ77Q8pvl+dhBcYDPIF7LCZ
gs3/JBrbLRt44jBa7MxTRFBZyJgTRo6W+3ixyrvemYfs5nDcAt3Uiq47vjVE0DYQF+RXxyOvOVI2sDVG
ggIZvcw238tUlejYAFStuICAdNR8iuGYjARIWYaVMOQepzZmxvPQHAbXNcyDntfI+gY+ny/fw3qOcple
a13BCbKqr+8I6C8fGdVseA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE ESTRUCTURA
EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

2016

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

CALENDARIO DE OBRA		SUMA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

8	3	2017
DÍA	MES	AÑO

OBSERVACIONES

LA OBRA SE REANUDÓ CON AVANCES DE OBRA DE CANCELERÍA Y PLAFONES EN UNA DE SUS TORRES Y EN LA OTRA SE ESTÁ EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE ENJARRES. LA OBRA TRAE UN ATRASO DE CUATRO MESES POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA.



NOMBRE : VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

DE CHIHUAHUA

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA DIFÍCILES CAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua

Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de Educación a Distancia.




Informe de obra 08 Marzo 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.

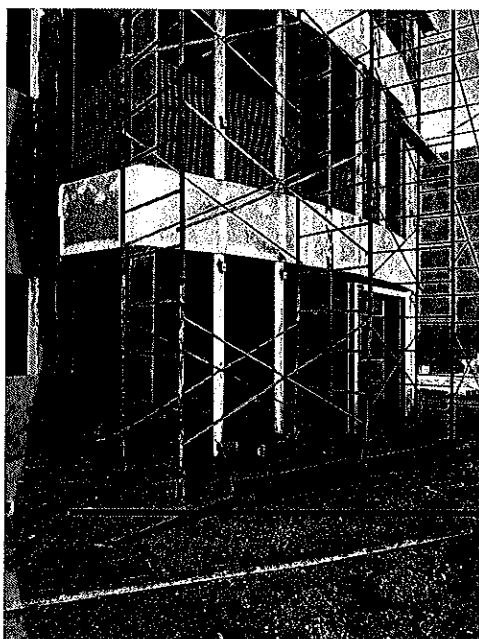

2 | vista exterior

Trabajos de herrería en
fachada.



Av. Tecnológico N° 2909, Col. 10 de Mayo C.P. 31310, Chihuahua, Chih., México
Tel. (614) 201-2000 Fax (614) 413-5187 Apartado Postal 2-1549
Correo Electrónico: director@itchihuahua.edu.mx www.itchihuahua.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No. 2909 COL. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 8 DÍA 1 MES 2016 AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN: 9 DÍA 1 MES 2017 AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 5 DÍA 4 MES 2017 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	49.75%	\$ 14,928,319.83	4510	60%	LA OBRA ACTUALMENTE PRESENTA AVANCES DE OBRA DE CANCELERÍA EN AMBAS TORRES. LA OBRA TIENE UN ATRASO DE OBRA DE CUATRO MESES POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARO. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN


CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO: cgonzalez@itcchihuahua.mx

TEL. 10 DÍGITOS: 6150712000 ext. 190

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE: DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

FIRMA: 

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)

OTROS (ESPECIFICAR)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua

Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de Educación a Distancia.



Informe de obra 05 Abril 2017

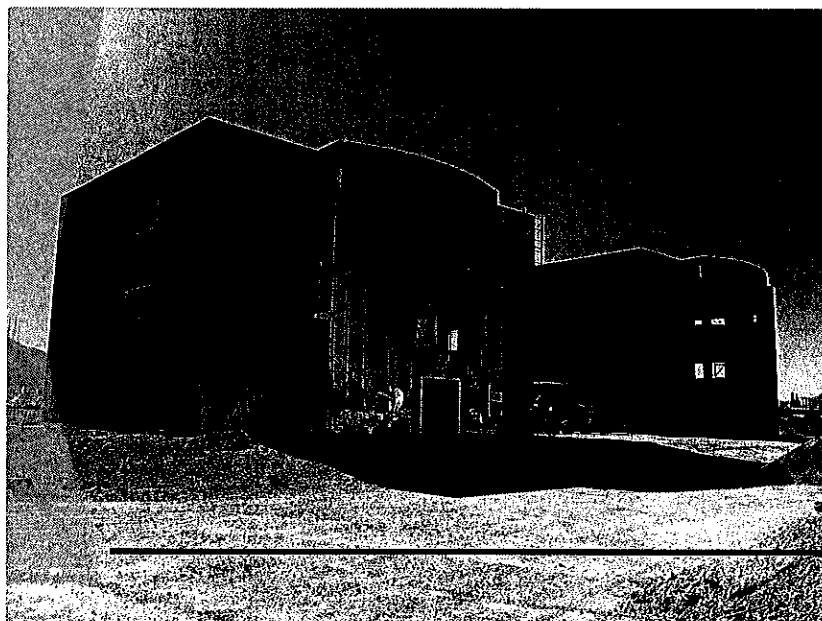

1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.



2 | vista exterior

Trabajos de cancelería en
fachada.



Av. Tecnológico N° 2909, Col. 10 de Mayo C.P. 31310, Chihuahua, Chih., México
Tel. (614) 201-2000 Fax (614) 413-5187 Apartado Postal 2-1549
Correo Electrónico: director@itchihuahua.edu.mx www.itchihuahua.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARIA DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION E
 INFRAESTRUCTURA FISICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
 DOMICILIO COMPLETO AV. TECNOLÓGICO No.2009 COL. 10 DE MAYO
 C.P. 31510 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 8 1 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN 9 1 2017
 FECHA 8 9 2017
 DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2016	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	49.76%	\$ 14,926,319.83	4510	62%	LA OBRA ACTUALMENTE PRESENTA AVANCES DE OBRA EN TABLAPROCA Y MUROS INTERIORES EN AMBAS TORRES. EN VENTANERÍA VA AL 50% DE AVANCE. LA OBRA TRAE UN ATRASO DE OBRA DE CUATRO MESES POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ARO. CARMEN JACQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN
 CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: cgonzalez@ictel.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS: 6142072030 ext. 190

FIRMA
 NOMBRE: DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA



SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE CHIHUAHUA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAG (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.




Informe de obra 08 Mayo 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.

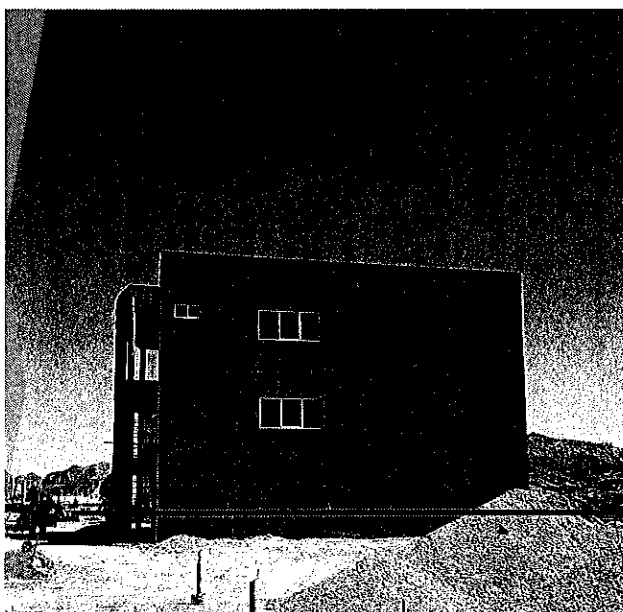

2 | vista exterior

Trabajos de ventanería en
fachada.



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
 DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No. 2509 COL. 10 DE MAYO
 C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 6 1 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: 9 1 2017
 FECHA: 8 6 2017

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	49.76%	\$ 14,926,319.83	4510	64%	LA OBRA ACTUALMENTE PRESENTA AVANCES DE OBRA DE 100% EN CANCELERA EN AMBAS TORRES Y UN 50% EN VIDRIERÍA FRONTAL. SE ESTÁN TERMINANDO MUROS DE TABLARCA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS. LA OBRA TRAE UN ATRASO DE CUATRO MESES POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ARO. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN
 CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRÓNICO: smoelgarcia@ichihua.mx
 TEL 10 DIGITOS: 5142012320 ext. 150

FIRMA: *Carlo*
 NOMBRE: VQ.B.O. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA: *[Firma]*



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESP)

SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.




Informe de obra 07 Junio 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.

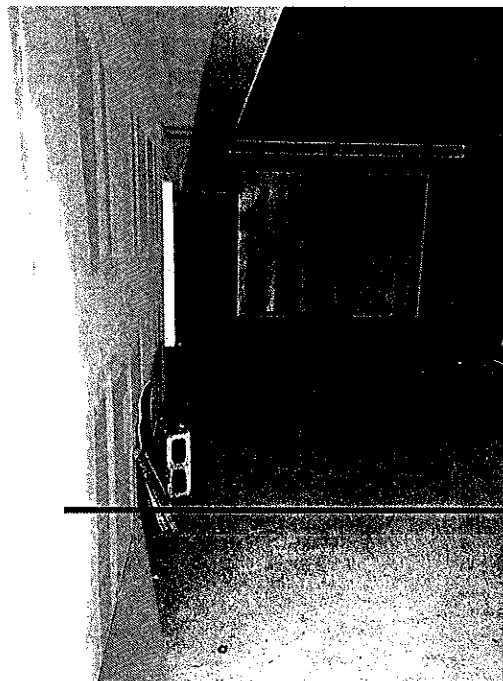

2 | vista interior

Trabajos de plafonería.



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No. 2809 COL. 10 DE MAYO C.P. 31370 CHIHUAHUA, CHIH.		2016 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CALENDARIO DE OBRA FECHA DE INICIO: 6 1 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 9 1 2017		FECHA DEL REPORTE FECHA: 3 8 2017	

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	51.57%	\$ 15,473,859.59	4510	66%	LA OBRA ACTUALMENTE PRESENTA AVANCES DE OBRA DE UN 66% EN VIGILANCIA, SE ESTÁN TERMINANDO DUCTERÍAS PARA CLIMAS Y SE HAN COMENZADO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE UN PASO DE OBRA DE CUATRO PASOS POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON EL INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: ARQ. CARIBEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CORREO ELECTRÓNICO: ggonzalez@itcho.edu.mx TEL 10 DÍGITOS: 6142012020 ext. 180	FIRMA:  FIRMADO: DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
---	--

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)	ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DESARROLLAR OTROS (ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN PÚBLICA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN

**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**



Informe de obra 3 Agosto 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.



2 | vista interior

Trabajos de pisos.



Concreto con fuerza

goXXhI9tVf+Dg+QSV/2IkqpxyG5eKOC5RnDMfz1tr8pSBEfla82OQwkQOPa7mwZAmjRC2ITWDIoaC
9N6eXmZLhhrI,PsV4UG19xMO6+J2TCWCDDTbDDY9xyMSkpWbPLRUs3oABVerJLq6NFYCYLoGeeohXRIH
tr5+RbJrXbWale76Lapl8dTxUDhNUySXa6BACAY5K3jyLF35EbDm;/CdSUKN50z87rUwEvWv1Xuh14d9/

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4437
FECHA:	26/5/2017 18:28:12
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 7A (SIETE EXCEDENTES) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$160,101.22 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$64,040.49	96,060.73	96,060.73

Importe total con letra
CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL:	96,060.73
I.V.A.:	15,369.72
TOTAL:	111,430.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000405636531
Folio fiscal:	35E0CA1A-DF2B-4D24-A4C0-602611A02849
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 26 2017 - 19:28:14

Sello digital del CFDI

XUizTOWtFaXhGLURA9Aaw2NEC2lyBVophBe2/1HhaR/J+Pc86q+ChCGYbDk+FlmAGExzTeUzLUu/1rGijEjcs
o2uhXF0aueS0x7WGptKJlrqTOzAtj5ngxZiPUCC9ghDf9kPnRIJLMQpCY9uY9pQPsNe8VOu8QkUzJqnKkMJT
bo4jflKFHNb3bs8mtpFHeoIkoyGOoseAquXOMcFmuQATWn3kDeCgIfyo9pLUhAY6699YzZHPT/hY82GToYVFor
n8suPkxs3AMI+mRjXhIEFwGwioh3W8uXPJs5JXaWRVPH6U5LHfmpwplSYn9PWpeNb/WHw/6/XI8/8M699A==

Sello del SAT

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
2017 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)	

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DE INICIO 8 1 2016 DÍA MES AÑO FECHA DE TERMINACIÓN 9 1 2017 DÍA MES AÑO	FECHA DEL REPORTE 5 9 2017 DÍA MES AÑO
--	--

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
F-411 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	51.57%	\$ 17,766,076.18	4510	68%	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE TODA SU VIGILANCIA Y CANCELERÍA EXTERIOR INSTALADA. SE ESTÁN INSTALANDO MUROS INTERIORES Y CERÁMICAS. LOS PLAFONES ESTÁN TERMINADOS Y SE ESTÁ INSTALANDO EL PUENTE DE CONEXIÓN DEL PRIMER PISO EN EL EXTERIOR SE ESTÁ TERMINANDO LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : CARGO : CORREO ELECTRÓNICO : TEL 10 DÍGITOS :	ARQ. CARMEN LAQUELINE GONZÁLEZ ARAGON JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 5502382@itcch.edu.mx 6142012000 ext. 190	NOMBRE : FIRMA DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA	VOBO DIRECTOR DE INSTITUTO FIRMA
--	--	--	-------------------------------------

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.




Informe de obra 4 Septiembre 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.

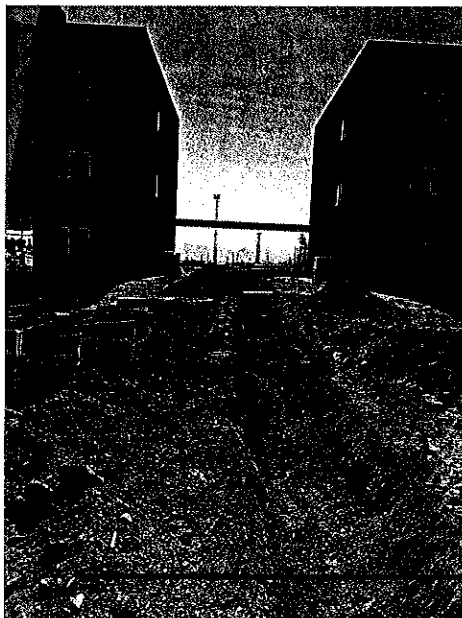

2 | vista exterior

Trabajos de conexiones de
servicios.



Concreto con fuerza

Documento Válido

Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287 , LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA

Domicilio: ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2

OBSERVACIONES

1.00

Importe total con letra

DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 29/100 M.N.

Método y Cuenta de Pago

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL: 1,799,070.94

IV-A:	287.851.35
-------	------------

TOTAL:	2.086.922,29
--------	--------------



Este documento es una representación impresa de un CFB

*Efectos fiscales al pago

Sere del Certificado del emisor: 00001000000406606243

Folio fiscal: CE5D5E3A-053C-43E6-BADC-C6A29FEC7CF7

No de Serie del Certificado del SAT: C00010CCCC004436074

Fecha y hora de certificación: Junio 26/2017 - 13:04:05

Sello digital del CFO:

Z'Wa+MVqNMLiq7Be5CYwroEgY2N/0eAxD4G0dMTp43C05/X1c9y9qqGmfetqHQTPIKC4Yp+0wRlj7hHxzgYalijg+co3161pc3U5o2G6X7jlbG5SS7uC7ZkHXQUGE9UrYC5bsU1pNIZC0fHP21pWC6S92+tp/MSwerCQtDHC3rtI29wWlpvgo5S5cv6fliCaj5leS3y5VjzCcX87n2D8c3+Al4iC05mT/DWY3/Sc51p986PlnqX3WpostIazS=iLnG0FDIC3hec2c7TyjsZ1NJSJZGsBgdzankMjLEfUtcCoGCKRzv2Ad24x5NK'WTDago6tmkdvh/23S/ukG42phhw==

C-20X-AZICRE.vK51935, SIKCapDcainCar, 39Ue4toyDor, 2wv83Nly4D8,imasN/Vb,mpa37%_a,FIaP, 20a

1080 LARK ST - N. WILMINGTON, DE 19806-7404 TEL: 301-634-9100 FAX: 301-634-9101

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4525
FECHA:	24/7/2017 16:54:18
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287 , LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:
C.P.:	06010	Ciudad:
		DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 9E (NUEVE EXTRAORDINARIOS) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LA OBRA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLÓGICO NO.2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$294,963.08 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$117,985.23	176,977.85	176,977.85

Importe total con letra
DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL:	176,977.85
I.V.A.:	28,316.46
TOTAL:	205,294.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406606849
Folio fiscal:	C45E002A-DC65-4863-B287-8F2E9454AA9D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 24 2017 17:54:25

Sello digital del CFDI

EFDwD/XuflHgxx9+Y19MbTWlwbKZVa0N4JXA0vaLilJmbvP27e4ddhDofmaLil8CPhz1tvHj0BVOEufHrHGoZZ
 cxFfMRwqkay8kxeJErfkqIFmdZ6Zw9Eq1icOM7HMI90sfM2AoHiWNnQvqJvshqKYPWiW23rHbe4gNZ9xgLOan
 mB6wqGIPBfwjfl4+54w34GOMZ6cmOICyE64MrolJszRxcFOXH+eeiJBkt9N1p7s8sufjJsed/9vTd1NCSZ7RhK
 lAzzErD/gs6xQJCdiN4Pk+vdYnSKDqLWnKQgoOh4z92ydtTb6uZnu7n8cYegrmGH1gkVW7/bnnVGfMgX7eMw==

CONTROL DE
ESTIMACIONES


Sello del SAT

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No.2809 COL. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DE INICIO: 6 DÍA 1 MES 2016 AÑO FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DÍA 12 MES 2017 AÑO		FECHA DEL REPORTE FECHA: 4 DÍA 10 MES 2017 AÑO	
2016 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA					

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	59.22%	\$ 17,766,076.18	4610	70%	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE TODA LA VIDRIERÍA Y CANCELERÍA INTERIOR INSTALADA. SE ESTÁN INSTALANDO ÚLTIMOS DETALLES DE CERÁMICAS. SE ESTÁ CABLEANDO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. EN EL EXTERIOR SE ESTÁN TERMINANDO LA CONEXIÓN DE LOS SERVIDORES.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: ARO. CARMEN JACQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CORREO ELECTRÓNICO: jacarmen@itcchihuahua.mx TEL. 10 DÍGITOS: 6142012000 ext. 180	VO. BO. PRESIDENTE DEL INSTITUTO NOMBRE: DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA FIRMA: 
--	---

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN

**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**




Informe de obra 4 Octubre 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.

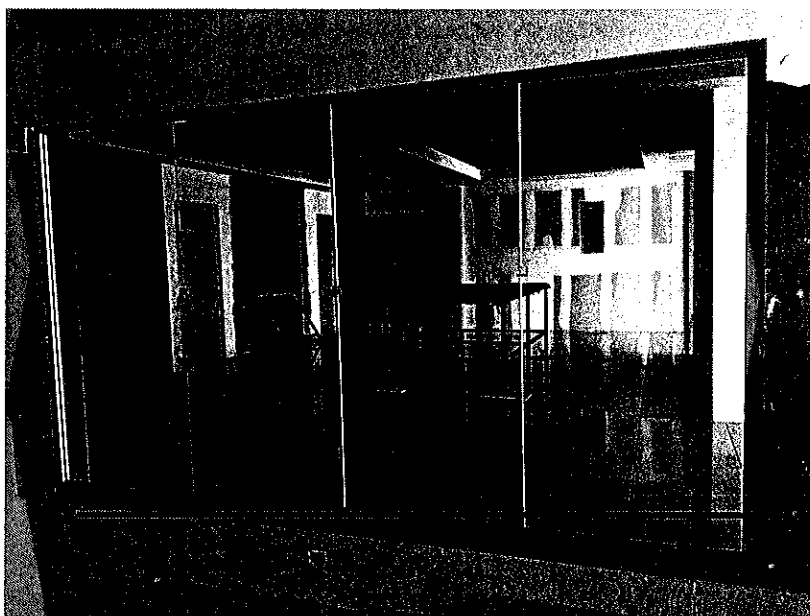

2 | vista interior

Trabajos de vidriería
interior.



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARIA DE DEFANACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E
 INFRAESTRUCTURA FISICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA
 DIA MES AÑO
 6 1 2016
 31 12 2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO


NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
 DOMICILIO AV. TECNOLÓGICO N.º 2809 COL. 10 DE MAYO
 C.P. 31010 CHIHUAHUA, CHIH.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014- 2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	52.47%	\$ 15,742,953.86	4510	72%	ACTUALMENTE SE ESTA PINTANDO EL INTERIOR Y EXTERIOR, SE ESTAN INSTALANDO ULTIMOS DETALLES DE CERAMICAS, SE ESTA TERMINANDO EL CABLEADO PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO, EN EL EXTERIOR SE ESTAN TERMINANDO LA CONEXION DE LOS SERVICIOS.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE : ARO. CARMEN JACQUELINE GONZÁLEZ ARAGON
 CARGO : JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: 580074142@ich.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS : 8142010000 ext. 150

FIRMA


VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA


SECRETARIA DE
 EDUCACION PUBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE CHIHUAHUA
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

**Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.**



Informe de obra 8 Noviembre 2017



1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.



2 | vista interior

Trabajos de vidriería
interior.



RAHECSA

Concreto con fuerza

Viernes 6 de sept

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4623
FECHA:	7/9/2017 17:33:18
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$1,403,559.88 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$561,423.95	842,135.93	842,135.93

Importe total con letra
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL: 842,135.93
 I.V.A.: 134,741.75
 TOTAL: 976,877.68



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406606849
Folio fiscal:	FE912D03-B05A-4ACF-8EBA-9C2172F83F13
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2017 - 18:33:23

Sello digital del CFDI

DH7BnUW9DwAbNW/3We5rzK/PyWNX9kBSnjb9aXoa6lhG5XIT0N9m0HGK/ep84igj6cV21N+soJOLCEM7eSc/oz
 wtfFtUyPtv6u4u95QIexTHaaKvdgqD3Bg3JQP/7mWgopz53n+KlWk8Fm1xjv+IXYOeeLx0UN2D0dTcjEaR+0z0
 dxNL6iduWIGWJYqWA+jukFO++XQrkGTdPOa4kUDIWIJGkYFyj8TtCgaGekA7aGInGxovP3gvoRegQLqXBXZlg
 /KeRucXafPC33GAauKOuRvhkhnfym11RqqVQkYJC3USUaQvUGGyn/NEcl7LDKhv47umbEG25e9uqFPlidqUQ==

Sello del SAT

2016
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UNIVERSIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
AV. TECNOLÓGICO No.2909 COL. 10 DE MAYO
C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA	SUMIA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

FECHA DE INICIO		
6	1	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN		
31	12	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	6	12	2017

[illegible]

CONJUNTOS DE PROGRAMAS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ ARAGÓN

JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

56020242@tech.edu.mx

TEL. 10404108 : 6142612200 ext. 180

NOMBRE: VOBO, DIRECTOR DEL INSTITUTO

DR JOSÉ RIVERA MEJÍA

SIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAW); PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
FAWCE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)


DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
DE CHIHUAUA
DIRECCIÓN

Construcción primera etapa de Torres de Unidad Central de
Educación a Distancia.



Informe de obra 6 Diciembre 2017

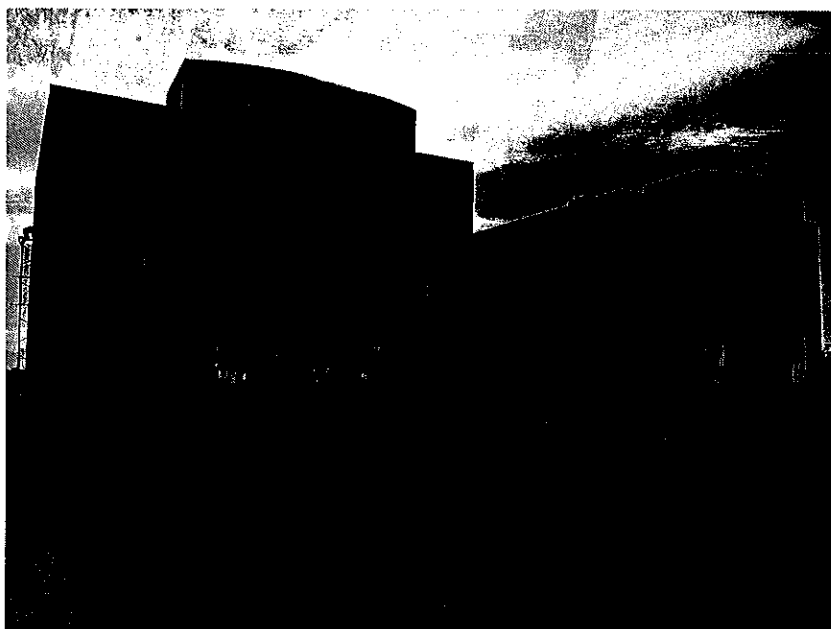

1 | vista exterior

Perspectiva general de
ambas torres.



2 | vista exterior

Trabajos exteriores de
banquetas.

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4686
FECHA:	3/10/2017 11:36:21
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
DIRECCION GENERAL

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	Teléfono:	
Colonia:	COL.CENTRO	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO
C.P.:	06010		

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 11E (ONCE EXTRAORDINARIOS) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2929, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$1,076,902.26 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$430,760.90	646,141.36	646,141.36

Importe total con letra
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 98/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL: 646,141.36
I.V.A.: 103,382.62
TOTAL: 749,523.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406606849
Folio fiscal:	E712C3B0-1B0C-48A2-89FE-2B059DBA7389
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2017 - 12:37:07

Sello digital del CFDI

I44PDtn7xs1poMOc4FmOCot+nm/g6eYru60FUJfzD20G80/M+E4B0E6yoc+vhNGzQP8AE925PoAftfpeEsXwRS
OLSy6qoiDzfkdkakilmHhwG7JaXfxxwhuUng8x5UHq8MVTugSphg74tXfJoidJtRb91I3zEoLJK3kcyZy+b9
vxwzJabixSBQhgephsBX1qL76i5GFpsYruG2NjFCZrAesHmhgw+P+98mMKraDeQx4+eEueP1qtwGSwonhZ
0B0rdJfCFgK4G9JdfWDw+9IQxy80qo6DFGplxqDrPoGGck2ladK5RKzbl4eR3olEfgTQ4ZLV+416yx+/W4w==

Sello del SAT

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 6 1 2016 DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN 30 3 2018 DÍA MES AÑO

FECHA 9 1 2018 DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

DOMICILIO AV. TECNOLÓGICO No. 2808 COL. 10 DE MAYO

C.P. 31810 CHIHUAHUA, CHIH.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
FAM 2016	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	71.95%	\$21,584,595	4610	4668	75%	ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO CON LA CONEXIÓN HIDRAULICA PARA LA DESCARGA GENERAL DE LOS EDIFICIOS, ADEMÁS DE LAS CONEXIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARO. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON

CARGO: JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: carmen.gonzalez@itc.mx

TEL. 10 DIGITOS: 6142012000 ext. 144

NOMBRE:

DR. JOSE RIVERA MEIA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA

REUNIR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

VIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

M (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

COE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

COEJOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA

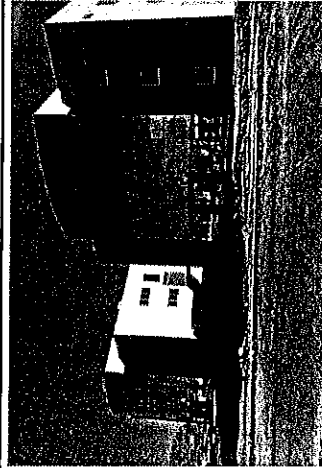

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO EXTERIORES DE TERRACERIAS PARA PLATAFORMAS DE CONCRETO

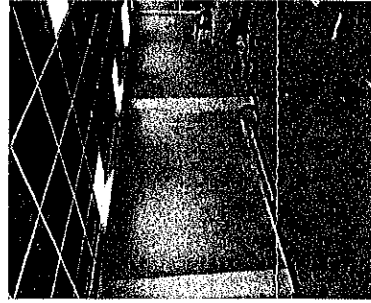

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE PLAFONES PARA RECIBIR LUMINARIOS ELECTRICOS

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4778
FECHA:	15/11/2017 12:58:53
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC,CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2929, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$417,095.67 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$166,838.27	250,257.40	250,257.40

Importe total con letra
DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL:	250,257.40
I.V.A.:	40,041.18
TOTAL:	290,298.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406606849
Folio fiscal:	A53AC498-E766-4FED-B21F-C0E3F3549D8F
No da Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 15 2017 - 13:58:57

Sello digital del CFDI

i9/4eTHdyPq2JvL6270nioXoz7jKkLJIBfGx+CimHHYzv+WxKBs8J7WrvFPsqCvzNk6G56nsYz8FQ1C7+Z8A
 zwrlGsQTIQolWyaFgJ8QLNoAI/IFMYqqonqUL7Lhu53aS9NY6lytMYRybvgrEWJH8SeAdR56ougQJLfnVPri+
 6psQrS5A6PrjA7vu+ic3KAkjouE4wvJEdw35rFLpq9lgJN02SIkVozEHmKBzZrWYRGEYmjpesesgAZzZdUdOt
 vX8hzlK+FgJwTtNSesdM4vifCziXTG5L2K1k9HI+WPzmMCXnitj9nYZjZ1vCPeeJSzIC368RfQnrCHFoHFA==

INSTITUTO CHIHUAHUENSE
 DE INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4779
FECHA:	15/11/2017 13:06:47
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287 LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2	Teléfono:	
Colonia:	COL.CENTRO	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO
C.P.:	06010		

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 12E (DOCE EXTRAORDINARIOS) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2929, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$2,588,819.70 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$1,035,527.88	1,553,291.82	1,553,291.82

Importe total con letra
UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL:	1,553,291.82
I.V.A.:	248,526.69
TOTAL:	1,801,818.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406606849
Folio fiscal:	D07103ED-9A15-420C-B92E-B236BFC2E428
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 15 2017 - 14:06:51

Sello digital de CFDI

etUslOwLdyUVosqwJVKNokXef6vSZYV9MCRMNNdvOCznXub+aimJIOSwVY3Fk7rP1xhKSeG96zsSbZ3kf1r6Y
 U99/NAWiidAQ4ZETAidYZuAOuGXO9J204enzWeqLgHMDsUNn4G0yTGIQLp71AfZibsBVnhRgRFOdNiokNbJL
 eCIRV95SWnjmVAC07e2x1cjz2nUA+NJGnZdMslk+Uv2L0Pb3HIqwgKKDeSmPnUrOB6hV4HGhrFJnaCOY/kCf9n
 ss7mCCK3FwQVW3QICAm21x3mTf8P5SIA15F2PQ95F3lmauYf5HfQav4aE15YXUwV3825NMm13a1e33v==

INSTITUTO CHIHUAHUENSE
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 DIRECCION GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO AV. TECNOLÓGICO No. 2809 Col. 10 DE MAYO
C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO 6 1 2016
FECHA DE TERMINACIÓN 30 3 2018

FECHA DEL REPORTE

FECHA 6 2 2018
DÍA MES AÑO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	71.95%	4510	4888	79%	ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO CON BANQUETAS Y ANDADORES EXTERIORES ASÍ COMO CON LA CONEXIÓN HIDRÁULICA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARO. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: sgonzalez@itcna.edu.mx
TEL 10 DIGITOS: 614201 2009 ext. 144

NOMBRE:

DR. JOSE RIVERA MEJIA

FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

SELLO OFICIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2809 Col. 10 DE MAYO


C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

NOMBRE


DOMICILIO
COMPLETO

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA

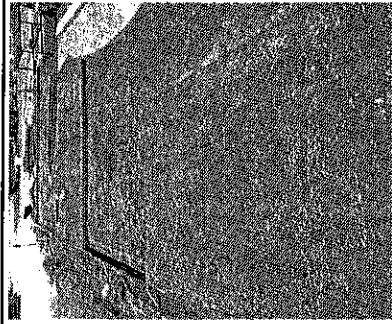

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO EXTERIORES DE BANQUETAS DE CONCRETO

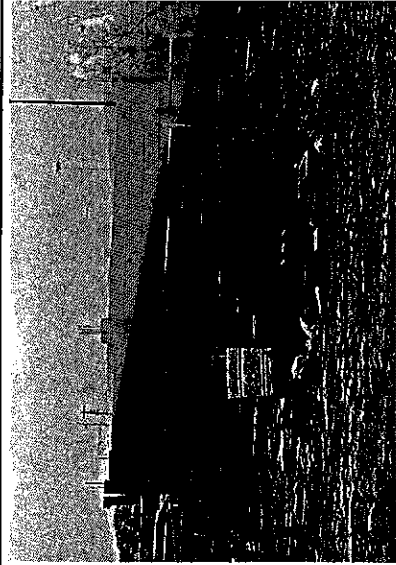

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE CUARTO DE MAQUINAS HIDRAULICAS

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
 DOMICILIO AV. TECNOLÓGICO No. 2808 Col. 10 DE MAYO
 COMPLETO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 6 1 2018
 DÍA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 6 2018
 DÍA MES AÑO

FECHA 8 3 2018
 DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	75.28%	\$22,487,446	4510	4868	77%	ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO CON LAS UNIDADES PAQUETE PARA LA CLIMATIZACIÓN DE LAS TORRES Y LA CONEXIÓN AL REGISTRO DE LAS DESCARGAS SANITARIAS.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ARO. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
 CARGO : JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: sgonzalez@it.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS : 6142012000 ext. 144

FIRMA

NOMBRE :

DR. JOSE RIVERA MEJIA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA DE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

BANCO DE CONSIGNE PRODUCTOS

DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2809 Col. 10 DE MAYO


C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

NOMBRE


DOMICILIO
COMPLETO

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCION DE
LA OBRA

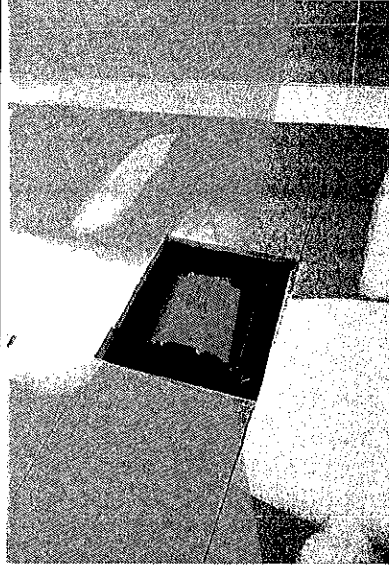

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO INTERIORES DE EXTRACTORES DE BAÑOS

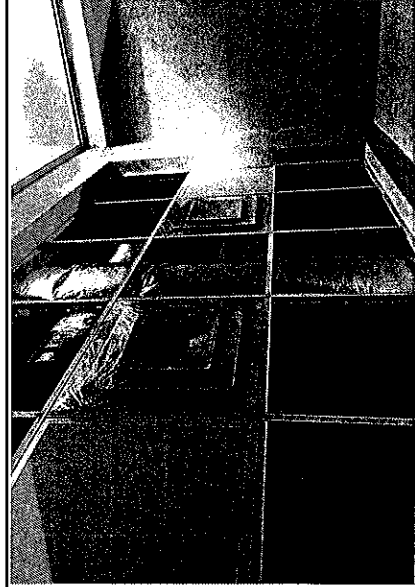

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACIONES DE DIFUSORES

RAHECSA**Concreto con fuerza****RAHECSA MATERIALES SA DE CV**

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32650

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Condiciones Pago: CONTADO DIFERIDO

Folio: 4869
 Fecha: 8/2/2018 17:58:14

Datos del cliente

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
 R.F.C.: TNM140723GFA Uso CFDI: I01 - Construcciones
 Domicilio: ARCOS DE BELEN No. 79 No. Int PISO 2, COL.CENTRO, C.P. 06010, DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO, , MEXICO

Observaciones: OTRAS DEDUCCIONES Y RETENCIONES:

-0.2% ICIC: \$0.00

-0.2% DIF: \$0.00

SUMA DE DESCUENTOS: \$0.00

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2929, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH ALCANCE DE ESTIMACION \$1,096,113.70 002-IVA \$175,378.19. AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA \$508,596.76 TOTAL DEVENGADO \$762,895.14 ESTIMACION SIN IVA \$657,668.22 NETO A RECIBIR \$762,895.14	657,668.22	002 - IVA - 105,226.92000	657,668.22

Importe con letra:

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100
 M.N.

Subtotal 657,668.22
 Impuestos Traslados 105,226.92
 Total 762,895.14

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000406606849
 76BE423F-35B7-41F3-B4B4-8C929B98BD59
 00001000000404486074
 Febrero 8 2018 - 18:58:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 INSTITUTO CHIHUAHUENSE
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE

RAHECSA**Concreto con fuerza**

RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32650

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Condiciones Pago: CONTADO DIFERIDO

Folio: 4870
 Fecha: 8/2/2018 18:08:10

Datos del cliente

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
 R.F.C.: TNM140723GFA
 Domicilio: ARCOS DE BELEN No. 79 No. Int PISO 2, COL.CENTRO, C.P. 06010, DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO, , MEXICO
 Uso CFDI: 101 - Construcciones

Observaciones: OTROS DESCUENTOS Y RETENCIONES:

-0.2% ICIC: \$0.00

-0.2% DIF: \$0.00

SUMA DE DESCUENTOS: \$0.00

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 13 A (TRECE EXCEDENTES) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2929, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH ALCANCE DE ESTIMACION \$201,085.47 002-IVA \$32,173.68 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA \$93,303.66 TOTAL DEVENGADO \$139,955.48 ESTIMACION SIN IVA \$120,651.28 NETO A RECIBIR \$139,955.48	120,651.28	002 - IVA - 19,304.20000	120,651.28

Importe con letra:


CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100
 M.N.

Subtotal 120,651.28
 Impuestos Traslados 19,304.20
 Total 139,955.48

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000406606849
 C9E4C373-6FBD-4AB8-8C7B-0573F918DEF2
 00001000000404486074
 Febrero 8 2018 - 19:08:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCION DE
LA OBRA

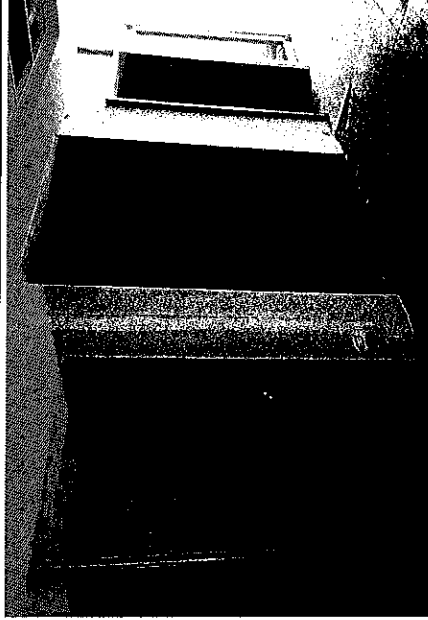

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACIONES DE PUERTAS DE SANITARIOS DE MADERA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACIONES DE SANITARIOS

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

3	5	2018
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

NOMBRE : ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON

CARGO : JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: cgonzalez@iich.edu.mx

TEL 10 DIGITOS : 6142012000 ext. 144

DR. JOSE RIVERA MEJÍA

VO BO DIRECTOR DEL INSTITUTO



SELLO OFICIAL
SECRETARÍA DE

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE INVERSIÓN, PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCIUDDO

FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA P
TEAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO


C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

NOMBRE


DOMICILIO
COMPLETO

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACIONES DE MAMPARAS PARA SANITARIOS

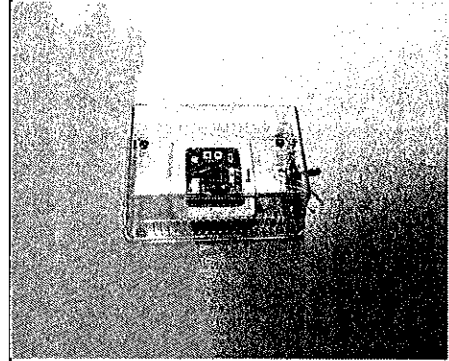

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACIONES DE CONTROLES DE CLIMA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
SECRETARIA DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION E
INFRAESTRUCTURA FISICA

AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DEL REPORTE

FECHA

5 6 2018
DIA MES AÑO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO

6 1 2018
DIA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN

31 12 2018
DIA MES AÑO

ACTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
CICLO AV. TECNOLÓGICO No. 2808 Col. 10 DE MAYO
COMPLETO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM 2016	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	75.28%	4510	4868	82%	ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO CON LAS BANQUETAS PRINCIPALES Y LATERALES DE LOS EDIFICIOS.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL MES DE MAYO SE HAN EJERCIDO \$22,487,416.00 QUEDANDO UN MONTO DE \$7,512,584.00 CON UN RECURSO FINANCIERO GENERADO DE \$1,150,921.72. REMANENTE TOTAL \$9,863,476.72. TRABAJOS PENDIENTES PARA EJERCER TODO EL RECURSO.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
REO ELECTRONICO: 6142012000 est. 144
10 DIGITOS:

FIRMA

VO BO DIRECTOR DEL INSTITUTO

DR. JOSE RIVERA MEJIA

ESTAMOS A LA ESPERA DE FINQUITAR LOS



SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA

UNIR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

ENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA DE COSTOS DE PRODUCTOS

(FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

(PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

EXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

BERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2809 Col. 10 DE MAYO

C.P. 371310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

NOMBRE


DOMICILIO
COMPLETO

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE BANQUETAS EN FRENTE DE EDIFICIOS

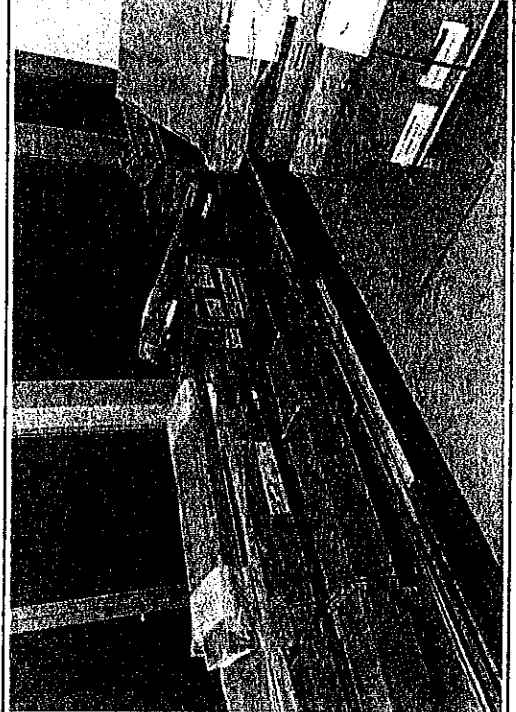

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE PREPARACION PARA LA INSTALACION DE ELEVADOR EN TORRE A

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO AV. TECNOLÓGICO No. 2808 Col. 10 DE MAYO
COMPLETO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 6 1 2016
DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN 31 12 2016
DÍA MES AÑO

FECHA 4 7 2017
DÍA MES AÑO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	76.40%	\$22,920,281	4510	4888	83%	ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO CON EL CABLEADO PARA LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y LUMINARIAS EXTERIORES, ASÍ COMO CON CONCRETOS EN EXPLANDA FRONTAL

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO : JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO : cgonzalez@itc.edu.mx
TEL 10 DIGITOS : 6142012020 ext. 144

FIRMA

NOMBRE :

DR. JOSE RIVERA MEJIA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE MOVILIZACIONES FINANCIERAS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAGE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOEI (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
 DESCRIPCIÓN DE
 LA OBRA

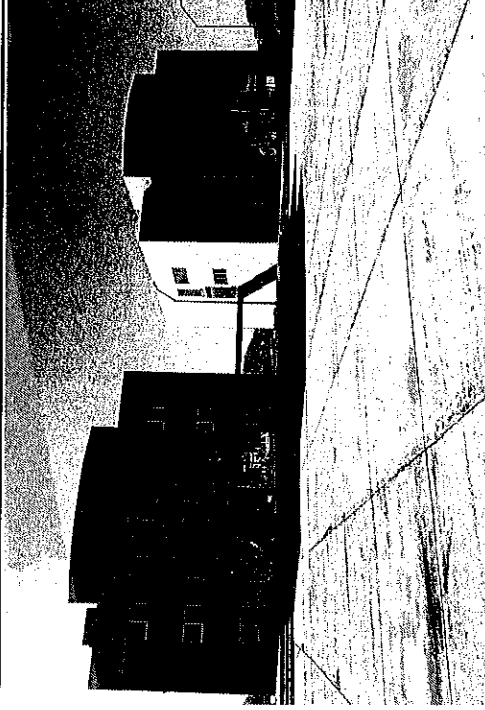

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE CONCRETOS EN EXPLANADA PRINCIPAL

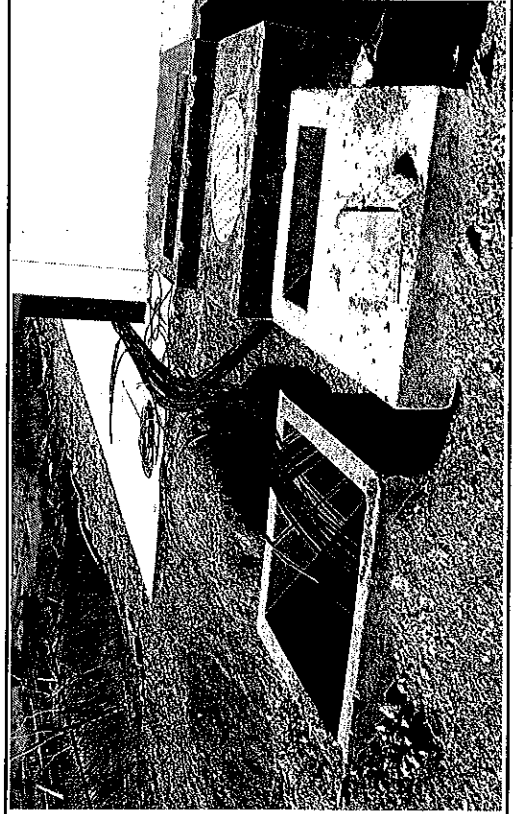

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL

RAHECSA

Concreto con fuerza

RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32650
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Condiciones Pago: CONTADO DIFERIDO

Folio: 4923
Fecha: 21/5/2018 13:25:24

Datos del cliente
Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA Uso CFDI: I01 - Construcciones
Domicilio: ARCOS DE BELEN No. 79 No. Int PISO 2, COL. CENTRO, C.P. 06010, DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO, MEXICO
Observaciones:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 13 E (TRECE EXTRAORDINARIOS) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. ALCANCE DE ESTIMACION DE \$190,706.60 002-IVA \$30,513.06 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA: \$88,847.86 TOTAL DEVENGADO: \$132,731.79 ESTIMACION SIN IVA \$114,423.96 NETO A RECIBIR: \$132,731.79	114,423.96	002 - IVA - 18,307.83000	114,423.96

Importe con letra:
CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 79/100 M.N.

Subtotal: 114,423.96
Impuestos Traslados: 18,307.83
Total: 132,731.79

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406606849
Folio fiscal: 6A8D5626-50EE-4AFO-AF82-17FB46DBD876
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 21 2018 - 14:25:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h3VcYJaTD8XVaYduBdal7G4Bx2dhl2zHxN4O7XTFPRZR/Z6XrqYczDR/tnYaBo36wEnWWp367K/hM/SQ2QR0gW
LZKiTrfGtM/nHq2gnQrRfx2Q72I9Zb6cMgKMx8Ux1EfRrPcmi0erH25mP1lc6anb2veAnGJWMmJxnY/SAxq/
3aehzlwru0JXvjRRWCSZpw+PSELVqb95gs+tgBnirXjv67927FLAKxrNLaZnSpN0sL9+NzzQk2pnWmO9v1ZXP
nv82sRVcGUm2CNNxb0eQX3G7eL6USDlJrK5u6Eeat7DC9vliqfXEs5vCU+FOzN9y1f8//rePvOrz94SoeYw==

Sello del SAT

KeVtSmuQQST6L7sFUPryecbv97B9rPDWjRyugF0w7XdjY6Kmc/Selmgk0/a93gObEWdZC/IWFMakgN
dZlriQD3Ilrk0G4fmujTbM5oqf2kzLQnAtcstvDTT10cWth3B8KoxDqfKZHKRX8YAgD8bvyXPEZWfAJ
SCeuef375GVCKmncUpEbREhd7OcSkym8hm5CDWnSucEB2Dhz3gCsSWwjfgZWgFCxEWoe5IFxETtibB0
ZdkRRFvcg2RDM4C/yDeX97baJOLBrjyih8vW3ExucMwLHvr85UyguNEJWvKY1ILWthjRequyplgPbwG

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIA
FISCALIA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL

RAHECSA**Concreto con fuerza**

RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32650

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir
 Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Condiciones Pago: CONTADO DIFERIDO

Folio 4930
 Fecha 7/6/2018 13:41:12

Datos del cliente

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/IT CHIHUAHUA

R.F.C.: TNM140723GFA

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Domicilio:

ARCOS DE BELEN No. 79 No. Int PISO 2, COLCENTRO, C.P. 06010, DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO, , MEXICO

Observaciones:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. ALCANCE DE ESTIMACION DE \$431,183.93 002-IVA \$68,989.43 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA: \$200,069.34 TOTAL DEVENGADO: \$300,104.02 ESTIMACION SIN IVA \$258,710.36 NETO A RECIBIR: \$300,104.02	258,710.36	002 - IVA - 41,393.66000	258,710.36

Importe con letra:

TRESCIENTOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal 258,710.36
 Impuestos Traslados 41,393.66
 Total 300,104.02

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

CFDI Relacionado: E558E785-1546-434F-8F2F-BD998D0E185E



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000406606849
 8BDD2A5F-CBC5-4AEB-A1A4-A60FEF9B2A03
 00001000000404486074
 Junio 7 2018 - 14:41:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO CHIHUAHUENSE
 DE INFRAESTRUCTURA
 EDUCATIVA

Sello Digital del CFDI

Dxnyxxh1mT5nBUCOfvdupGRDFwXwWr54Pq8IK3SRhWsyTLG2I28Jlr0EyTwDZyTuxQBbs7S2Z6piU71GVYq
 LA6bXcdBDYDx89BIMtVDFrJeXgiZ0aiZLBu2IJADK714hArK1jatOA3qg/yjeQ6SYAR6IT69uSEIHSKFiPWf3
 Mz26YAJeOihd9AXSzfwwzPCOE2dLkDmdIKdLfx58qFyB9Q19rL+L0d3XXF4TvsPxf8W1js6lcvf14rsFBIGY
 4SkC9qor721QATEqOLbf8BV/OZJfuSXe979S6+jyKccVwEr/CILnE/yd/vNLmj1Tx8HlntOktUPBJTa35bQ==

Sello del SAT

fh+WXGLG7K9MC34K5xppg8Q5ElvGtKc+E6DmlbRM7m+9eReh9JZb6zmlqldi4jwU8q62lb9ZsJ8IMG5k
 ndH6ku0YTG999zbwDfmoudoC9OC07MKwa2A8moMNP9UWz448nQQwi22kM5eTIO6Gs1mbDhA/YonazKa
 OtYXxHnWILhv0/UqIGHn7mLgSwcvqWOfsjhRMtHvyo3hUP147gubM7m33GUQz24YLj/Ofm7Kt74X5VA
 +S61LYLk/hSwX6cFL7z5dFLaLlK0l8Z02u310t2xZAFFOSpglUlxpnvICTZuvuy8WjP1IltchcKglNj
 44k1qNGtviPX9pp8o1H9w==

2017

2017
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA	SUMA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

FECHA	6	8	2018
	DÍA	MES	AÑO

FECHA DE INICIO	DÍA	MES	AÑO
	8		2018

FECHA DE TERMINACIÓN	31	12	2018
	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO	AV. TECNOLÓGICO No. 2509 Col. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

[illegible]

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



SECRETARÍA DE
SELLO OFICIAL EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN

**AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)**

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

PROXOE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ARO. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON

CARGO - JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO:
diponza@red.uchile.cl

TEL 10 DÍGITOS: 6142012000 ext. 144

FIRMA

NOMBRE :

DR. JOSE RIVERA MEJIA

FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PROXOE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2011-FAVE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO


SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO
 C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
 DESCRIPCIÓN DE
 LA OBRA

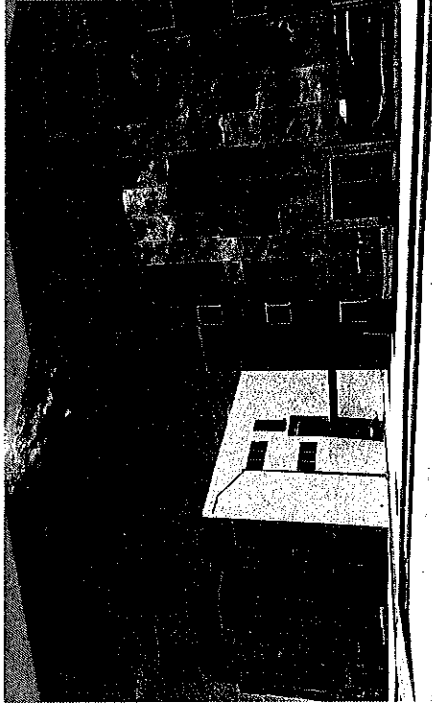

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE CONCRETOS EN EXPLANADA PRINCIPAL



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE INSTALACION DE ELEVADORES



RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32550

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	4961
Método de pago	PPD - Pago en parceladas o diferido	Fecha	30/7/2018 16:36:57
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Condiciones Pago:	CONTADO DIFERIDO		

Datos del cliente

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA **Uso CFDI:** I01 - Construcciones
Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. 1200 No. Int QUINTO PISO, XOCO, C.P. 03330, BENITO JUAREZ, CD DE MEXICO, , MEXICO
Observaciones:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. ALCANCE DE ESTIMACION DE \$1,461,607.47 002-IVA \$233,857.20 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA: \$678,185.87 TOTAL DEVENGADO: \$1,017,278.80 NETO A RECIBIR: \$1,017,278.80 NO. DE IDENTIFICACION: 01-CONSTRUCCION UNIDAD: ESTIMACION	876,964.48	002 - IVA - 140,314.32000	876,964.48

Importe con letra:


UN MILLON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	876,964.48
Impuestos Traslados	140,314.32
Total	1,017,278.80

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

CFDI Relacionado: 4E870863-38FD-49D5-BB94-388F2CB195F0



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000406606849
 34E98501-C060-4761-8BF2-2C0CA687A57F
 00001000000404486074
 Julio 30 2018 - 17:37:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZT3XS8y7tk0oECKsRcO2XU/BKwho/Avn4NyfonRH9jDIIUUCcmQcdPYijk+ZOSVTgZFsAOLWvgoKwrvoN9e+1
 ikKNh90Fwi8pmR05rDIT5VHJWc9r+mJrsTnOXSEs6gJ1AbuXHasK+VQok5OHG8+FERFcB/w7mdBv73y3IWHtZ
 ny/bOXNoSoNBUDUG/IEP1yWHnTRddm/PYOQdsMHKru7fbWk4szMYIYoyPtXG4Djnk73FKPLDSLYtZVEijSKB
 Vdny6m/mxnkVzYpUqGnGgAG13Z2tdf8Vj7hkcGTVsV1w7Dtr8X2ft351nAItNKjs+vk6++wf34NdxT0ZXXw==

Sello del SAT

nr4/MJF88rtJvkaZp/ytBu+HgMdPhuOc+28il4zOUA8oH+ol20VX6mt9a6X3gJIX3Wb+8q8Mc7k4JL7
 hlsFrc0sFj8RDMJCwDdt7K0GDEekSdqfC6HtdL3ajcEeSW71FLIKWxl+nEtCjECOWFzxOs9cJW2PNL
 jnFkiED2R3HLaqKc7++NmGN7RX8qUldUAh9MvV0dxxQOOkIXzKNKdgzS70JDHl6/WEF8IWwZDtdwGgs
 Z6wZkjcC8uE0R4IBQdIFd5OuUOGXMy2lspRz9lIKlJPGxLH6LT06Qp5UP2e5Ea1s6rX4t+fHeHXdM+
 eW5Yh6fOv5Y8RwORxi1U9g==

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

NOMBRE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO	AV. TECNOLÓGICO No. 2908 Col. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA CHIH

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA	SUMA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO			
6	1	2016	
DÍA	MES	AÑO	

FECHA DE TERMINACIÓN			
31	12	2018	
DÍA	MES	AÑO	

6	9	2018
DÍA	MES	AÑO

FECHA

[illegible]

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : _____ ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO : _____ JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: _____ cgonzalez@ibich.edu.mx
TEL 10 DIGITOS : _____ 0142012000 ext. 144

NOMBRE :

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA DE INVERSIÓN, PLAN DE INVERSIÓN, PLAN DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
FFAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PROEXOE(PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

**AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
 DESCRIPCIÓN DE
 LA OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE CONCRETOS EN EXPLANADA PRINCIPAL

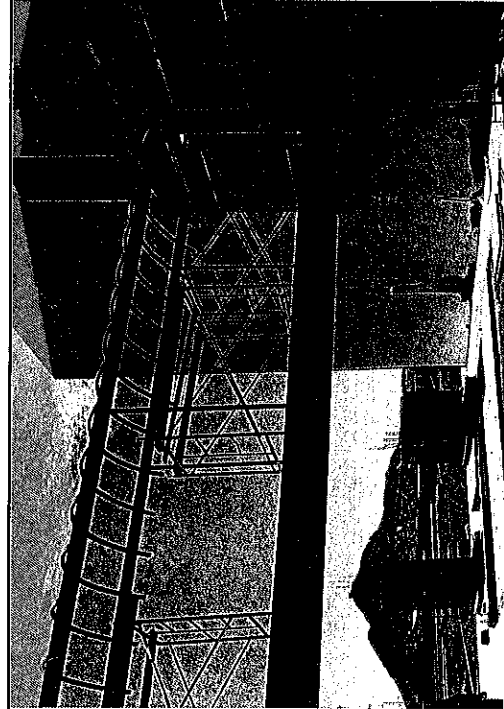

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PUENTE DE CONEXIÓN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO AV. TECNOLÓGICO No. 2808 Col. 10 DE MAYO
COMPLETO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO 6 1 2016
DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN 31 12 2018
DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA 3 10 2018
DÍA MES AÑO

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	82.35%	\$24,702,615	4510	4888	ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO CON ACABADOS DE PINTURA, LA TERMINACIÓN DEL PUENTE DE CONEXIÓN, PRUEBAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SE ESTA INSTALANDO EL SEGUNDO ELEVADOR.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ARO. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO : JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO : cgonzalez@itcchihuahua.mx
TEL 10 DÍGITOS : 01-62013000 ext. 144

NOMBRE :

DR. JOSE RIVERA MEJIA

FIRMA

V.O.B.O. DIRECTOR DEL INSTITUTO



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAGE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO FINALES DE PINTURA EXTERIOR

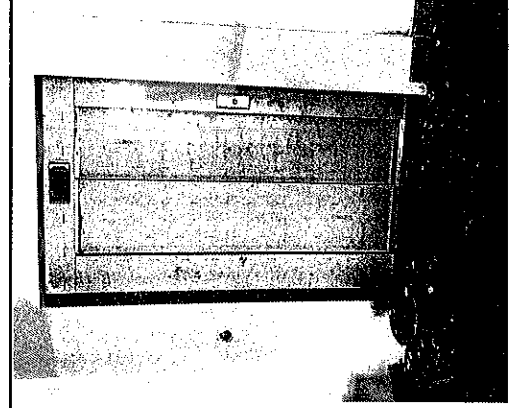

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACION DE ELEVADOR TORRE 'A'

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4624
FECHA:	7/9/2017 17:42:01
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909 COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$909,930.71 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$363,972.28	545,958.43	545,958.43

Importe total con letra
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 78/100 M.N.
Método y Cuenta de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUBTOTAL:	545,958.43
I.V.A.:	87,353.35
TOTAL:	633,311.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406606849
Folio fiscal:	D35FBB59-25A9-443B-8D41-EE01BA8C001C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2017 - 18:42:05

Sello digital del CFDI

e8Rxx+BpwQCyTxkYhHDrH9UB0z1tKLS0IKwMOQAnoL63VKNa3nuyO6H99N2QXyhpqIBet9QceRPRPI+XJCHQQ
 CSmCeX09+ts4pxMrB/PcUotJfNdN+Bj5IGpM8qHPHilrzMsyzJIRikf054YvWzNLsDYg3Tg6hYnVw3An/Nkt
 uyFrp5A/TPJ8MoRUtcFueh3FEZBpblupfK9d0N+hYU7q+55Zs+m7ANeakFsWwEm7f4UKQXqM+ui65jo2oecVwK
 EK4OV9HbSwdpl+gp+5YG3gr+EXWgV58FoCuBz6Auy1c/e3/15MQLX6evamEgs4IDfxp9FRD62OQKPeQsdctw==

Sello del SAT

RAHECSA

Concreto con fuerza

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4625
FECHA:	7/9/2017 17:45:46
Documento Válido	

RAHECSA MATERIALES SA DE CV	CESAREO SANTOS No. 6287
	LA CUESTA
RMA970102417	32650, JUAREZ CHIHUAHUA
	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: CESAREO SANTOS 6287, LA CUESTA, 32650, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA	
R.F.C.: TNM140723GFA	

Domicilio:	ARCOS DE BELEN No. 79 Int. No. PISO 2		
Colonia:	COL.CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	06010	Ciudad:	DELEGACION CUAUHTEMOC, CD DE MEXICO

OBSERVACIONES	
---------------	--

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 11 A (ONCE EXCEDENTES) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN AV. TECNOLOGICO NO. 2909 COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. CON UN ALCANCE DE ESTIMACION DE \$189,286.55 MENOS UNA AMORTIZACION DE ANTICIPO DE \$75,714.62	113,571.93	113,571.93

Importe total con letra	
CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	
Método y Cuenta de Pago	
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	

SUBTOTAL:	113,571.93
I.V.A.:	18,171.51
TOTAL:	131,743.44



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406606849
Folio fiscal:	A54A5864-98A6-47F3-A4C6-5CCA41E48E72
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2017 - 18:45:50

Sello digital del CFDI

pwJ7wiegVGjFLmCLWBzWmUucgE8QNM2xZBty70BuTzv63rzMSFePqnptffTIRNIY7UEyDwzGDRVTZpVn5E2
 TqgP4gNEXbXNcNw6yJfAsyRJeKJinsD4GbwXAmoWTtcvyZQihSj+NO+veaHF16N8kin7/Hv8BN/NB+tsIGQ7S
 aQDeH77xz/EyQ3K9RSDvylWCEfqgKUQPV+CM+GnWoiEbboEafuj5WdFYGonXNYxz8rQF862+wTpVOIAJuzrhj
 ib6TU+YxQMMyDmGIHwuUWkSHt7zdIbh3qUEOJu7EDJcOLo01EzbG9nnhCk8ID/IM7IBFpgoFt7hX/+yc/bXw==

Sello del SAT

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
SECRETARIA DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA
AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA 6 11 2018
DIA MES AÑO

FECHA DE INICIO 6 1 2016
DIA MES AÑO

FECHA DE TERMINACION 31 12 2016
DIA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO
C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	83.00%	\$24,829,655	4888	89%	ACTUALMENTE SE ESTA TERMINANDO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE CONEXION, SE ESTAN REALIZANDO PRUEBAS ELECTRICAS A LOS CLIMAS DE LOS EDIFICIOS Y SE ESTA TRABAJANDO CON LAS SALIDAS DE EMERGENCIA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON

CARGO : JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO : ggonzalez@ites.edu.mx

TEL 10 DIGITOS : 6142012000 ext. 144

FIRMA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

DR. JOSE RIVERA MEJA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE DEPÓSITOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM I FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017
PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
 DESCRIPCION DE
 LA OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS FINALES DEL EXTERIOR

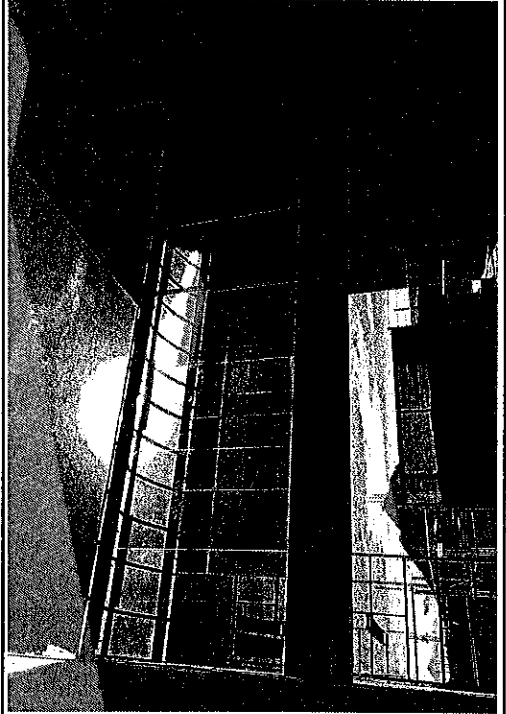

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE INSTALACION DE VENTANERIAS EN PUENTE DE CONEXIÓN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO AV. TECNOLÓGICO No. 2806 Col. 10 DE MAYO
COMPLETO C.P. 31910 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 6 1 2016
FECHA DE TERMINACIÓN 31 12 2018

FECHA 6 12 2018
DÍA MES AÑO

2017
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	67.12%	\$26,137,118	4510	4868	92%	ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO EL DETALLADO DE PINTURA, RESANES Y ACABADOS Y SE ESTA TRABAJANDO CON LAS ESCALERAS DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARO. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: 000078400@chih.edu.mx
TEL 10 DIGITOS: 014301-20039 ext. 144

Confer
FIRMA

NOMBRE: DR. JOSE RIVERA MEJIA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
[Signature]
FIRMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEJOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DIRECCIÓN

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO


C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

NOMBRE


DOMICILIO
COMPLETO

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA

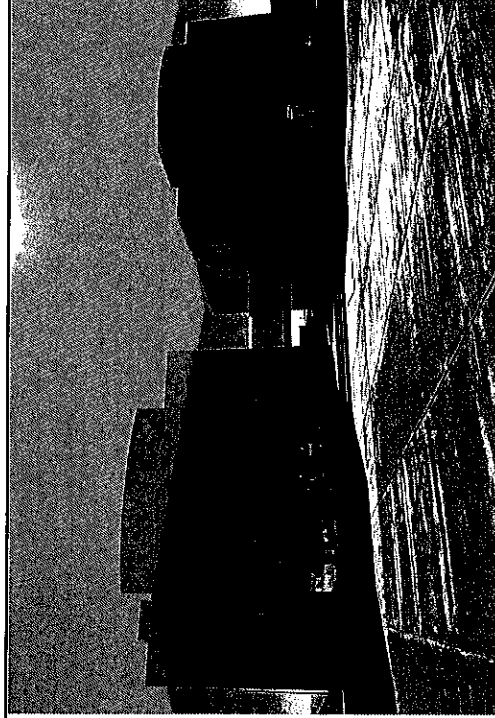

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO FINALES DEL EXTERIOR

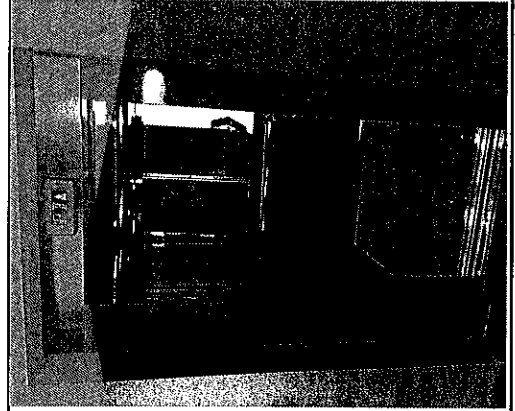

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE ELEVADORES TERMINADOS -FUNCIONANDO



RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32650
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	4982
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	18/9/2018 11:48:50
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Condiciones Pago:	CONTADO DIFERIDO		

Datos del cliente

Cliente: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
R.F.C.: TNM140723GFA Uso CFDI: I01 - Construcciones
Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. 1200 No. Int QUINTO PISO, XOCO, C.P. 03330, BENITO JUAREZ, CD DE MEXICO, , MEXICO

Observaciones:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN. AV. TECNOLOGICO NO. 2909, COL. TECNOLOGICO, CHIHUAHUA, CHIH. ALCANCE DE ESTIMACION \$682,993.09 002-IVA \$109,278.89 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA \$316,908.80 TOTAL DEVENGADO: \$475,363.19 NETO A RECIBIR: \$475,363.19 UNIDAD: ESTIMACION NO. DE IDENTIFICACION: 01-CONSTRUCCION	409,795.85	002 - IVA - 65,567.34000	409,795.85

Importe con letra:
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
19/100 M.N.

Subtotal	409,795.85
Impuestos Traslados	65,567.34
Total	475,363.19

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000406606849
76327985-FEEC-4BA6-88BC-FA1C4C7B90F1
00001000000404486074
Septiembre 18 2018 - 12:48:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WgjfmVBqJDP2HPif2qb3o4wJ7aON+H30+EnWbohApD2lCj6D6qKpCROH8UwkMswpgv6u4qV4fBaoDZFD0eW
/Op9+wUJ8I7CAfS8KNwX9YSydsFgFhZ9QmXkFgdD8UVx9UFmf606KqKbuzv0CCNZBzJLU4Kv4RCivtBaQ99
qF0GSbkjyrolb8wtPA0MHAGO17tqJsvCJlt+w3dTNvS8AvZA9TfKvny74Foz25AINDCFykzbzTXUx6D0h1G0dk

ING.
DE
FISC.
DIRECC. GENERAL



RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32650

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Condiciones Pago: CONTADO DIFERIDO

Folio: 4983
 Fecha: 18/9/2018 12:03:09

Datos del cliente

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
 R.F.C.: TNM140723GFA Uso CFDI: I01 - Construcciones
 Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. 1200 No. Int QUINTO PISO, XOCO, C.P. 03330, BENITO JUAREZ, CD DE MEXICO, , MEXICO

Observaciones:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 17 (DIECISIETE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN. AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. ALCANCE DE ESTIMACION \$742,287.15 002-IVA \$118,765.94 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA \$344,421.24 TOTAL DEVENGADO: \$516,631.86 NETO A RECIBIR: \$516,631.86 UNIDAD: ESTIMACION NO. DE IDENTIFICACION: 01-CONSTRUCCION	445,372.29	002 - IVA - 71,259.57000	445,372.29

Importe con letra:
 QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.

Subtotal: 445,372.29
 Impuestos Traslados: 71,259.57
 Total: 516,631.86

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000406606849
 DAFF04A6-78F1-4AB9-8348-8DAE66C76E8F
 00001000000404486074
 Septiembre 18-2018 - 13:03:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO
 DE
 FISCAL
 DISTRITO

INSE
 GRA
 VA
 DAL

Sello Digital del CFDI

QY1/JKBSlj1azDpLjVuvk68IVGMUYbywRqJXbQHaATNBjcfLei/KJn3hfzE9nv5RdbNS/Eilqxa3Ylqx7EpMB4
 9iWHEHREjr641f9xfAF4eWXF5aIZrbX6P2waHuKFG5Zud0ljXG2xnUMJMDKcLjtQqIFmTToyteeh6mugNF2egO
 EFuJWd+67I2y/tbqJtHvWb+XUeH7RcUBNJfF8Z2+PBy7zYRP4vgh0a3losDcZ9UyTCH6FtD24xdcWX8pFj93n
 1CstWbXpvh714bpO/7b2KyGr9YBylc9qWBOiq54b9Eo4qQ8CO/GemNCDOFVwD+kCwdQr7i1l1oq6o375vDQ==

RAHECSA**Concreto con fuerza**

RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32650

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Condiciones Pago: CONTADO DIFERIDO

Folio: 5020
 Fecha: 8/11/2018 14:00:02

Datos del cliente

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
 R.F.C.: TNM140723GFA Uso CFDI: 101 - Construcciones
 Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. 1200 No. Int QUINTO PISO, XOCO, C.P. 03330, BENITO JUAREZ, CD DE MEXICO,, MEXICO

Observaciones:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 18 (DIECIOCHO) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN. AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. ALCANCE DE ESTIMACION \$635,787.08 002-IVA \$101,725.93 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA \$295,005.20 TOTAL DEVENGADO: \$442,507.81 NETO A RECIBIR: \$442,507.81 UNIDAD: ESTIMACION NO. DE IDENTIFICACION: 01-CONSTRUCCION	381,472.25	002 - IVA - 61,035.56	381,472.25

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 81/100 M.N.

Subtotal 381,472.25
 Impuestos Traslados 61,035.56
 Total 442,507.81

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000406606849
 1F57CCAB-3616-4F83-9A55-8014BA8CA362
 00001000000404486074
 Noviembre 8 2018 - 15:00:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cSfQc8KDFk4u14iwudSi76sSlaAQSCG5shw5KjO3Wk/QG1Kz3aUg6FmZ7s4vQlmdtDafgXgYWU4d3gGxDf
 aq6s0VoyFp53b7i0Z22Dxd/JqBjFwGbCLISNaBF3tlx7/yibQZhcdeWlAp6+gkbRpAbFG18h+KQOU9wU8epq
 tNeoXCSdpxSxFyAkREOWG+zimJoRYaGv+zgaI9Ucz8uGpbepOf+3pncNjXZdIRliWcoTu591NgIKUZWuwY234h
 Vc6RebXjX6UKTE6rcIVWYPUW66I7GhdEsGCGaLtp6RcCt99fLshZK6galyNjgqDWhDOHq3wUt6dKUoudA00Q==

Sello del SAT

oaMTOL0VsiS14NtA5KluC1a4/saOuQpNO63NbD+AR0I4UrKKOSBXF5+EBC+TxzdagC+Z029fneGR0P2
 ajnDyzqOQQfc3TnDBWkqj+osaxv98k8/zzcKkezX1T5NG1Uqr6/r5vrvlqHajU3yesStMBYajoyDzbs



**INSTITUTO CHIHUAHUENSE
 DE INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL**

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DEFENSA E INGENIERÍA Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA
8 DÍA 1 MES 2019 AÑO

FECHA DE INICIO
9 DÍA 1 MES 2016 AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN
31 DÍA 3 MES 2019 AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO AV. TECNOLÓGICO No. 2005 Col. 10 DE MAYO
C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	87.12%	4510	4888	92%	ACTUALMENTE ESTAN POR TERMINAR LOS TRABAJOS DE LAS ESCALERAS DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA PARA FINALIZAR CON LA OBRA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZÁLEZ APACON
CARGO : JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO : cgonzalez@itcchihuahua.mx
TEL 10 DÍGITOS : 6142012030 ext. 144

NOMBRE :

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

FIRMA

VOBO: DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
 DESCRIPCIÓN DE
 LA OBRA

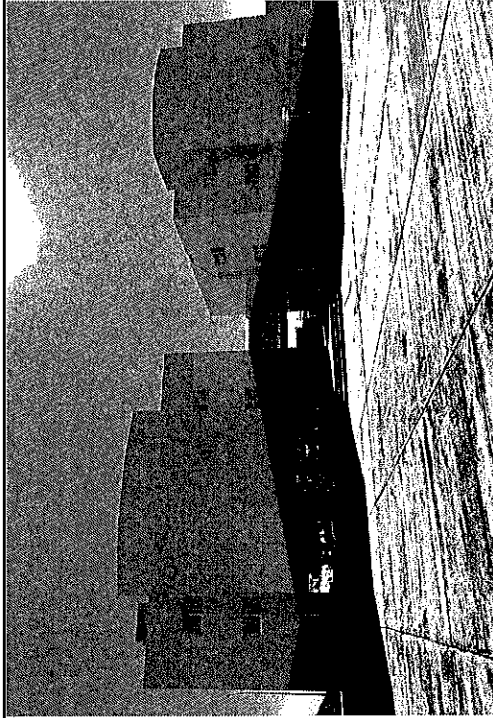

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS FINALES DEL EXTERIOR

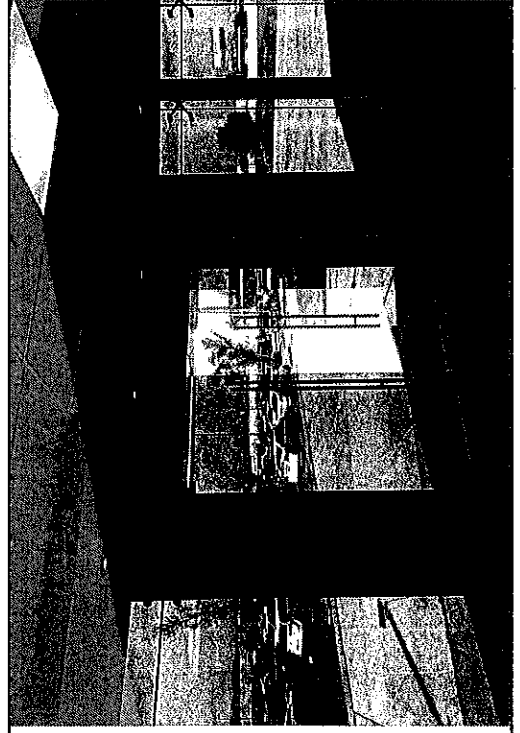

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE DETALLES GENERALES

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE
SISTEMA INSTITUCIONAL

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
6	1	2016	31	3	2019

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
6	2	2019

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

[illegible]

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



NOMBRE :

NOOMBRE : ARQ. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO : JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: zgonzalezca@lch.edu.mx
TEL 10 DIGITOS : 6142012000 ext. 144

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA

RECUCION

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

PAG (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

**AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO FINALES DEL EXTERIOR

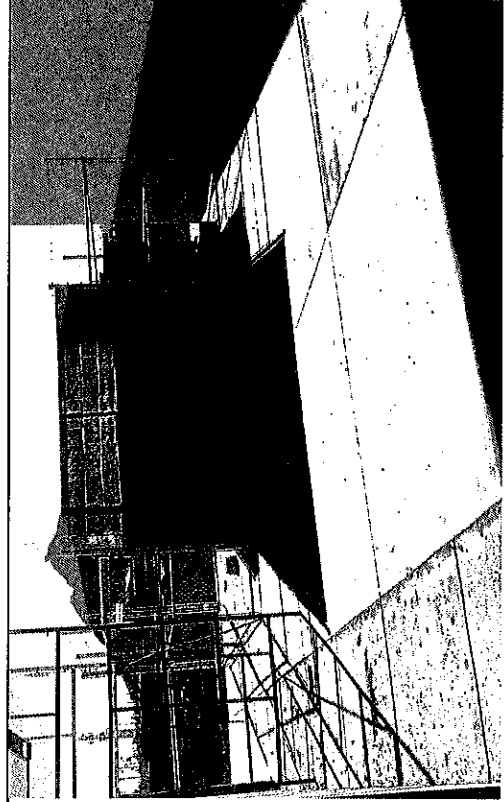

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE MALLAS CICLONICAS

RAHECSA**Concreto con fuerza**

RAHECSA MATERIALES SA DE CV

RFC: RMA970102417

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32650

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Condiciones Pago: CONTADO DIFERIDO

Folio: 5044
 Fecha: 2/1/2019 11:19:44

Datos del cliente

Cliente: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/IT CHIHUAHUA
 R.F.C.: TNM140723GFA Uso CFDI: I01 - Construcciones
 Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. 1200 No. Int QUINTO PISO, XOCO, C.P. 03330, BENITO JUAREZ, CD DE MEXICO,, MEXICO

Observaciones:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	ESTIMACION NO. 19 (DIECINUEVE) DEL CONTRATO NO. ICHIFE-002/16 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN. AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. TECNOLÓGICO, CHIHUAHUA, CHIH. ALCANCE DE ESTIMACION \$1,380,528.10 002-IVA \$220,884.50 AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA \$640,565.04 TOTAL DEVENGADO: \$960,847.56 NETO A RECIBIR: \$960,847.56 - UNIDAD: ESTIMACION NO. DE IDENTIFICACION: 01-CONSTRUCCION	828,316.86	002 - IVA - 132,530.70	828,316.86

Importe con letras


NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.

Subtotal: 828,316.86
 Impuestos Traslados: 132,530.70
 Total: 960,847.56

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:
 Folio fiscal:
 Clave de Serie del certificado del SAT:
 Fecha y hora de generación:

00001000000406606849
 A8685307-B3A7-45D0-A303-C93BE655560C
 00001000000404486074
 Fecha: 2019 - 12:19:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

Valor Digital del CFDI:

cQySjRAOKg6GdRjx/0zrvSg5zBbg7ZQvM89Z0x9Jmro.pog:ECzhG0oNG5oEGh3CzFJiWhkgBZ55xHGMpWHQYAU
 RyLNSXoEzzVhoy4IRhubQdiWg+H23ab3wYyerqM+kGPlRDEtyUjW+LxyjHetZGj/oa5ImSiXVm2wLZMbtAOxa
 iHHAzVlqubhqoifKrnLSPWJ46C285mitQKqUdFbk3hz3/OT+Tv5VD0J+tsRReyImpJ98UYmcPM5yVJ8gye018
 cFOInN07x4/uJ4ct8jRlBgy4U9kNy6GEiPFEsuRF9imqFElKra9p8nn4VUyDIWrs2xSLyVzqjNpHOe4p3gg==

Sello del SAT

ae94h+nbxg6Y5PAIECcKkyW2unvEQu7OQCgl+14D5nuTrZg6MoM++baPGKWjtIzmcjBKL3i5o8Jqwdkq

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA

AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No. 2008 Col. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 6 DÍA 1 MES 2016 AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DÍA 3 MES 2016 AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 6 DÍA 3 MES 2019 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	90.32%	4510	4888	93%	ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO LOS TRABAJOS DE LAS ESCALERAS EXTERIORES DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA, EL RENDIMIENTO GENERADO ES DE \$2,315,025.78.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARG. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON

CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: 580028282@itich.edu.mx

TEL 10 DÍGITOS: 01-42012000 ext. 144

NOMBRE :

DR. JOSE RIVERA MEJIA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE CONSTRUCCIÓN FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAGE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA

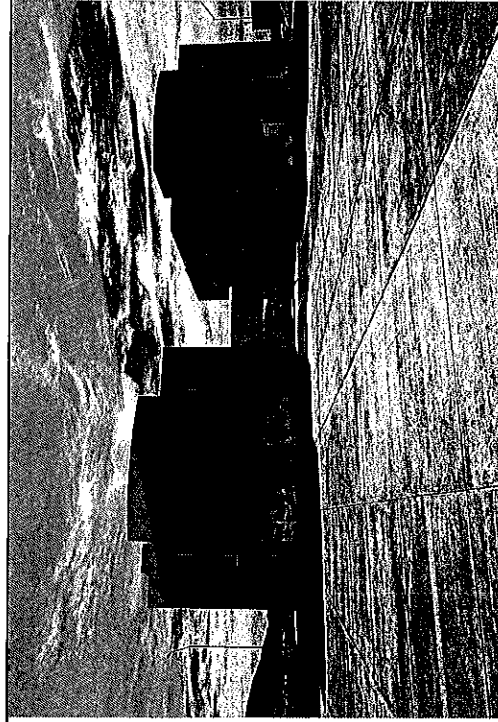

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO FINALES DEL EXTERIOR

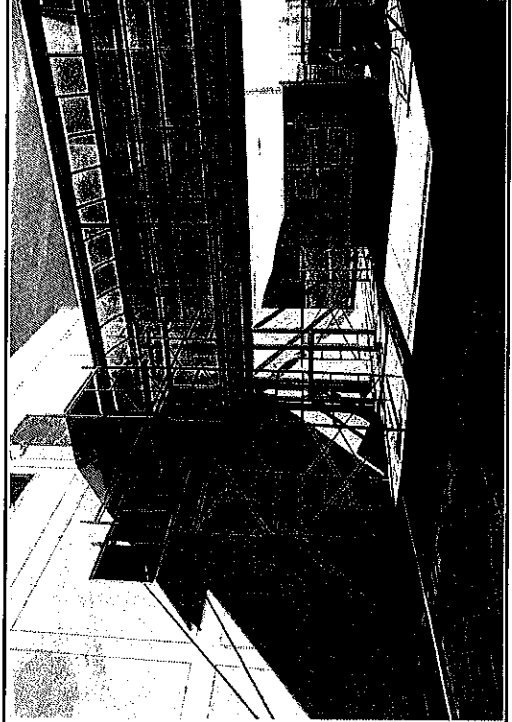

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE HERRERIA EN ESCALERAS DE EMERGENCIA

2019

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DOMICILIO
COMPLETO

FECHA DE INICIO	DÍA	MES	AÑO
	30	4	2019

FECHA DE TERMINACIÓN	DÍA	MES	AÑO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

4	4	2019
---	---	------

DIA MES ANO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

[illegible]

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ARO, CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON

CARGO : JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

CORREO ELECTRONICO: sgonzalez@idich.edu.mx

TEL 10 DIGITOS : 61-2012000 ext 144

NOMBRE :

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAQE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAVE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

**AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO


SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO
 C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
 DESCRIPCION DE
 LA OBRA

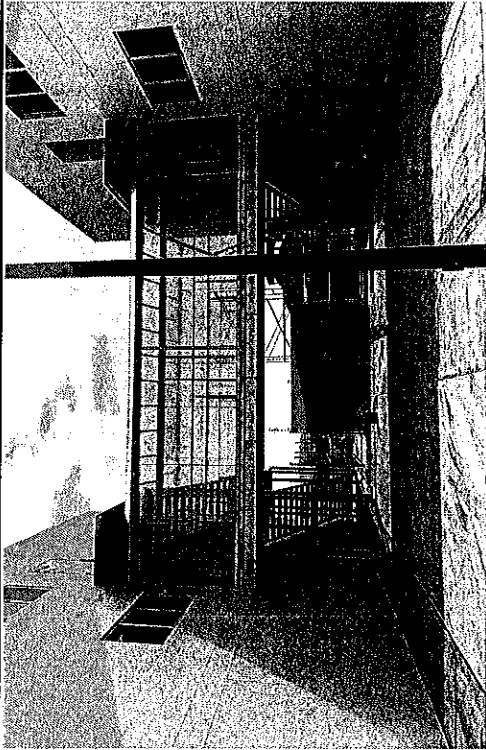

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS FINALES DE ESCALERAS DE EMERGENCIA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS DE INSTALACION DE REFLECTORES

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO
COMPLETO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO 6 1 2016
DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN 31 12 2019
DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA 8 5 2019
DÍA MES AÑO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%	\$			
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	90.32%	\$27,087,965	4510	4868	ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE TERMINACION LAS ESCALERAS EXTERIORES DE SALIDAS DE EMERGENCIA, EL RENDIMIENTO GENERADO ES DE \$2,515,925.16.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ARO. CARMEN JAQUELINE GONZALEZ ARAGON
CARGO: JEFA DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: cgonzalez@ich.edu.mx
TEL. 10 DIGITOS: 0142012003 ext. 144

FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE:

DR. JOSE RIVERA MEJIA

FIRMA

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.


UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA

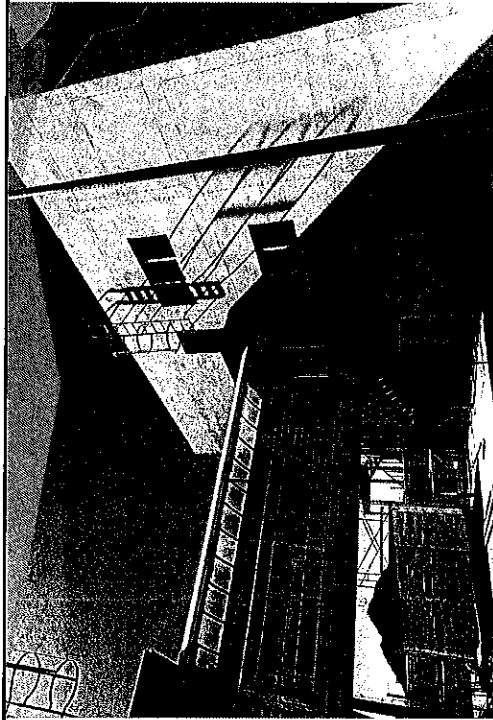

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO FINALES DE ESCALERAS DE EMERGENCIA

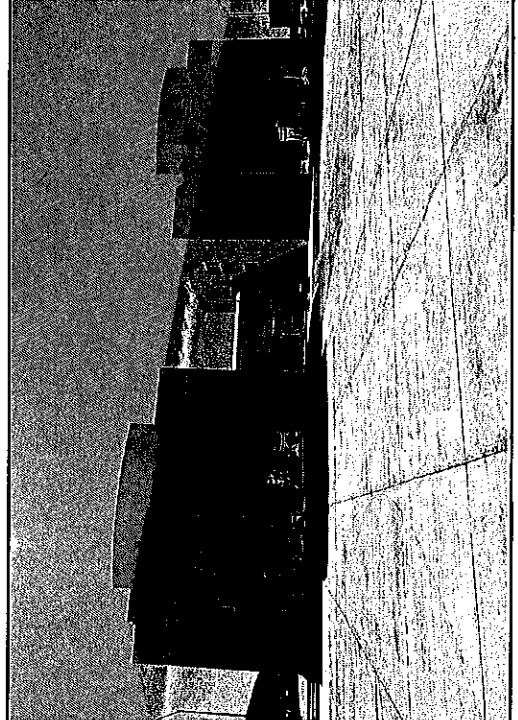

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACION DE REFLECTORES

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO	AV. TECNOLÓGICO No. 2008 Col. 10 DE MAYO C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

FECHA DE INICIO		
6	1	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN		
31	12	2019
DÍA	MES	AÑO

6	6	2019
DIA MES AND		

FEC

[illegible]

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : _____
 CARGO : _____
 CORREO ELECTRONICO: _____
 TEL. 10 DIGITOS : _____

NOMBRE :

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO

DR. JOSE RIVERA MEJIA

FIRMA

B142012000 ext. 'A3

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA

CONCRETE

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

TEAM (FONDO DE APORTACIONES MULTITIPLES 2012 A 2017)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAOPE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

**PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)**

**AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO No. 2909 Col. 10 DE MAYO

C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA

CONCEPTO Y/O
DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO FINALES DE SEÑALÉTICA Y LIMPIEZA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TRABAJO DE INSTALACION DE PERSIANAS Y MOBILIARIO

VITB5003222G8

BLANCA ESTELA VILLEGAS TORRES

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

VALLE REAL, No. Ext 5730, Col. VALLE DEL ANGEL II,
C.P. 31115.

FOLIO FISCAL C2556637-F623-AAC9-ABE9-3A5C161D964F

SERIE

FOLIO

392

FECHA Y HORA

2019 / 05 / 23 11:08:15

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: TNM140723GFA

Razón Social: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO / INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD, No. Ext 1200, No. Int QUINTO PISO, Col. XOCO C.P. 03330

Municipio: BENITO JUAREZ

Estado: CIUDAD DE MEXICO, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma Pago: 99 - Por Definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000403088396

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 31115

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-23T11:10:15

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
43	H87 - Pieza	52131602	ENRRO	persiana enrollable 2000 WHITE PLATINUM 2.02 x 1.60 INSTALADAS EN EL EDIFICIO 1 PISOS 1, 2 Y 3	\$ 0.00	\$ 1,123.82	\$ 48,324.26

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto 002 - IVA	Tipo Trasladado	Base \$ 48,324.26	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 7,731.88	Impuesto 002 - IVA	Tipo Retención	Base \$48324.26	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$7731.88
-----------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--------------------------	----------------------

44	H87 - Pieza	52131602	ENRRO	persiana enrollable 2000 WHITE PLATINUM INSTALADAS EN EDIFICIO 2 PISOS 1, 2 Y 3 ORDEN DE COMPRA190050	\$ 0.00	\$ 1,123.25	\$ 49,423.00
----	-------------	----------	-------	---	---------	-------------	--------------

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto 002 - IVA	Tipo Trasladado	Base \$ 49,423.00	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 7,907.68	Impuesto 002 - IVA	Tipo Retención	Base \$49423	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$7907.68
-----------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------------------	----------------------

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 97,747.26
IVA TASA 16%	\$ 15,639.56
IVA RETENIDO	\$ 15,639.56
TOTAL	\$ 97,747.26



Sello Digital Emisor

Z6u8K4JhUJhGhEXy3R6h37KH+WSgw00bKMEredJbfr7Nlt1yZ7YpuG7ZotdIEIvlnauWSzsTQFYmBTshsvxvFz8+0BCSSikPIAWRZZqoXIGYRY7RQAQu2L6Sc0/50LJuh/SyI+VtsHK+e1fFX7K6sby8G2+ROynIBQ
QQor7KwOLAMeuf4omFQ+xA64V2KcenuA4UqVcso5TU/Mn3JMe21lQmdkUc7qXJturCMRlqANmYt+snYH23e4Tre4xCi6Q5S2dXA+v3edQE39AGJToVqcMkcdJaiJ5rG+FkhiAyUEVgkRqOMVOyWsuWJQ7VdeJhKMin
hQ==

Sello Digital SAT

LU5BwVfhiqAEVdXgRzoygS76p65FMWYkE3LBq+GLP0JBwtEBoTDLC7xAuHnB4xLpGuVnesOGT4L0Bq3E0f62A/VvdcnCWTextMeTyzMuMnh2wHk4XeG7KZbelyUX9TdFagLngriaIa3wWdSR6JLJlyPAICBWyB4Az
BkOD5IdTOYXnjKzpuS1eAs+IYvgal1goLhR2IYu4geh3a5B0Uehb/T+7pUqZEplN7HjZWE+xxG9Ls/yLLandNMWA4vsT3c0taB9hwiP0W/Mupnc5wAAgTbrO3hd6nt3nO9NkoS19AVNk7qicCh3j7iDpFhJ4hRIGDIhOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1-1]C2556637-F623-AAC9-ABE9-3A5C161D964F[2019-05-

23T11:10:16]SAD110722MQA[Z6u8K4JhUJhGhEXy3R6h37KH+WSgw00bKMEredJbfr7Nlt1yZ7YpuG7ZotdIEIvlnauWSzsTQFYmBTshsvxvFz8+0BCSSikPIAWRZZqoXIGYRY7RQAQu2L6Sc0/50LJuh/SyI+VtsH
K+e1fFX7K6sby8G2+ROynIBQQQor7KwOLAMeuf4omFQ+xA64V2KcenuA4UqVcso5TU/Mn3JMe21lQmdkUc7qXJturCMRlqANmYt+snYH23e4Tre4xCi6Q5S2dXA+v3edQE39AGJToVqcMkcdJaiJ5rG+FkhiAyUEVgkRq
OMVOyWsuWJQ7VdeJhKMinhQ==[00001000000402636111]

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Página 1 / 1



OFICASA SA DE CV

RFC: OFI850703E75

e-mail: facturaciónjz@oficasa.mx

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Teléfono:

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

Agente:

A - 11385

29/5/2019 12:09:16

CHS06

Código:

12012002

Datos del cliente

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio:

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA

TNM140723GFA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ave. Universidad No. 1200 Quinto Piso, Xoco, C.P. 03330, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad SAT	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	H87	56111501 - D220P	RECEPCION EXTEND, SECCION PRINCIPAL C/CENIZO LINEA ITALIA	6,528.00	0.00	002 - IVA - 2,088.96	13,056.00
2.00	H87	56111501 - D220A	RECEPCION EXTEND, SECCION ADICIONAL C/CENIZO LINEA ITALIA	5,557.00	0.00	002 - IVA - 1,778.24	11,114.00
58.00	H87	56101703 - D1535	ESCRITORIO MAGISTRAL SIN ACCESORIOS C/CENIZO LINEA ITALIA	2,312.00	0.00	002 - IVA - 21,455.36	134,096.00
20.00	H87	56112100 - OH510	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS CABASSO OFFIHO NEGRO	812.00	0.00	002 - IVA - 2,598.40	16,240.00
4.00	H87	56101702 - D106	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS C/ CENIZO ITALIA	1,892.00	0.00	002 - IVA - 1,210.88	7,568.00
116.00	H87	56112103 - N122N	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA EN TELA C/NEGRO L. ITALIA	434.00	0.00	002 - IVA - 8,055.04	50,344.00
6.00	H87	56101700 - D630	MESA DE JUNTAS 221X120 CM C/CENIZO ESTRUCT. ALUMINIO ITALIA	5,985.00	0.00	002 - IVA - 5,745.60	35,910.00
3.00	H87	56101713 - D631	EXTENSION PARA MESA DE JUNTAS C/CENIZO EST. ALUMINIO ITALIA	3,815.00	0.00	002 - IVA - 1,831.20	11,445.00
83.00	H87	56112100 - GD500T200	SILLA OPERATIVA INDI C/BRAZOS TELA C/NEGRO GEBESA	1,667.00	0.00	002 - IVA - 22,137.76	138,361.00
4.00	H87	56101500 - GB5460180BP43BP20	LIBRERO ALTO 4 ENTR C/PTA INF 84.4X30X181.6 CM STORM GRAY/PL	5,252.00	0.00	002 - IVA - 3,361.28	21,008.00
2.00	H87	56101700 - GB5575120BP43BP20	MESA REDONDA 120.8X74 CM STORM GRAY/PLATINO SPAZIO	2,540.00	0.00	002 - IVA - 812.80	5,080.00
6.00	H87	56101700 - D135	CREDENZA COLOR CENIZO LINEA ITALIA	4,758.00	0.00	002 - IVA - 4,567.68	28,548.00
31.00	H87	56101700 - GB51408P43BP20	CONJUNTO OPERATIVO 160.8X143.6X74 CM STORM GRAY/PLATINO	4,892.00	0.00	002 - IVA - 24,264.32	151,652.00
6.00	H87	56101702 - D305	ARCHIVERO MULTIGAVETAS C/CERRADURA C/CENIZO LINEA ITALIA	3,039.00	0.00	002 - IVA - 2,917.44	18,234.00
2.00	H87	56101700 - GB5120BP43BP20	CONJUNTO EJECUTIVO 180.8X230.4X180 CM STORM GRAY/PLATINO	12,250.00	0.00	002 - IVA - 3,920.00	24,500.00

Importe con letra:

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 96/100 M.N.

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

667,156.00

106,744.96

773,900.96

PEDIDO: 47628

REMISION: 31651,31652,31653,31654

CODIGO: FICH-AD-FO-005

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

0000100000407433437

13DC3B5F-236D-4F08-B8C9-FA2F085005D8

00001000000404486074

Mayo 29 2019 - 13:09:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HJ+kJ5CPAzWmTreN0zGWxG6d/q/COPhfw5d9Fllq8tcJCCUOnQvJlz+ZZdaGast2ofzvaXq0wS45hddtF+fNzi
guwRjbyfcigtSrLRTkAH6W2xRSTG6MG0mcXpCTu9qaYQXpQ5DqxBCTRgk4ajxkzJLzerUU52lbt41bLg7UP
XmXOF3/DyzDnny3hXJ7HKIA5wJYgO4CGTYpeRVh5nWUuOgrTE0tNuxec9VfGwuAAejfC6B2f8HVN9vcdBb8I
XZex656U0B+fgJYwMgGXVafFdMXtF6Gr/o7ITRwEd8WOEAAmJTPXIGG45XMYIZGSQoZ4mO2SLjNzaOI87Q==

Sello del SAT

ORIDicPbbQZMjn2JBzm8sgL6P309CgK8O65hNcs9+lkG6JepR4AaXS2KUFkeAEKSBP18hN77ocHnp+Ex
FBoPrDMVOKGM1H8UgHKuIXruBAKHJT6dM2TJ1YIMudXB+9Jhumz0Lh4IZRhVEL4xZFcDYEAJ+ay6mP35
RVh19DFCHeCvsBT9Ms08Qn1tZUe2EB4ChQ7AEaQqL68JBgHf7tPfuQTa4V2kmOutr/Y+VhZROYHcGGoj
7Nz0ZzUmigIVVLM8p4oVOAKbuCES38Lvv6KmOTKcSO1goNfz86K7q14hx042Mz5V/x011ldqXehW36g
sYfWwCaEQnhvHIW2nYubQ==

RFC emisor: OIJC760705GT4
 Nombre emisor: Cristian Manuel Ortiz Jaquez
 RFC receptor: TNM140723GFA
 Nombre receptor: Tecnológico nacional de México/Instituto tecnológico de Chihuahua
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12E8B-5F1E-4502-9EEB-799B46A7769E
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31105 2019-05-23 12:57:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
46191501		6	H87	Pieza	5600.00	33600.00			
Descripción	Alarmas contra incendio								
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	33000.00	Tasa	16.0000%
					IVA	Retención	33000.00	Tasa	16.0000%
									Importe
									5280.00
									5280.00
46191501		70	H87	Pieza	360.00	25200.00			
Descripción	Detector de Humo								
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	25200.00	Tasa	16.0000%
					IVA	Retención	25200.00	Tasa	16.0000%
									Importe
									4032.00
									4032.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 58,200.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 9,312.00
 Impuestos retenidos IVA \$ 9,312.00
 Total \$ 58,200.00

Sello digital del CFDI:

BYjlyG0qNsBqD3WmIXhu6UDPEJKCSpWRPzbQnXwXwnq/27gLFQ4Aul3XbgTic+2O9fMGanoVBhr3s32WE/M5GqxM65hav4a6iIAJTLbzIhrFIdQA3jwVvRmhq1Hce8IHbRt8laH6AbK+poJOZO06DdP9YJ9Seg5EnuowzDA4OecgNtzX+8fyIXSclsy2qUumAw23cqK/5g9lra3ITUDuQ+b9oUzwZANsCv5c/k2+aCgJq+gYBXSH3+dStzIMoTzheHB/poJmsMDI4I0R8e1gszOocokDDcYpXmVVoOH4bu2cH2+qqBfKNA/xur1OVG494iIF0Yw5rLHQU9L5ROQ==

Sello digital del SAT:

HK8c1fJc9oCaZk17NLJkHhEQhkNDz5Evp+RG32WRqJW11/Na768g41xor39gEXGCMZrbWJ0ggRyHP1kGmNXEAIR0cY95V0Rz8PLP6hA/PgSTY5Q8rZTewVWvH2LrIE1UMXvXOcJKveOphYUIBNwUaAVUrY6TAgrOhuhOFGA1BV/MZ9fDyweukE6aK3WVHgLDQfyRhlpfLaxooEBhu1QJyxw4kZRNvIJwSQ49CNmmHPa1RwWQOeqrTsTN+FdcveXZEJISZwNgK28nRHE2UfypVo8/ZFAX6Vzsdm/eTc1NqXlaaRme+Lqc9JBuHdnWVgm9EhubcDOaC3sRtrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12E8B-5F1E-4502-9EEB-799B46A7769E|2019-05-23T13:00:58|SAT970701NN3|BYjlyG0qNsBqD3WmIXhu6UDPEJKCSpWRPzbQnXwXwnq/27gLFQ4Aul3XbgTic+2O9fMGanoVBhr3s32WE/M5GqxM65hav4a6iIAJTLbzIhrFIdQA3jwVvRmhq1Hce8IHbRt8laH6AbK+poJOZO06DdP9YJ9Seg5EnuowzDA4OecgNtzX+8fyIXSclsy2qUumAw23cqK/5g9lra3ITUDuQ+b9oUzwZANsCv5c/k2+aCgJq+gYBXSH3+dStzIMoTzheHB/poJmsMDI4I0R8e1gszOocokDDcYpXmVVoOH4bu2cH2+qqBfKNA/xur1OVG494iIF0Yw5rLHQU9L5ROQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23 13:00:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Se recibió a entera satisfacción el bien, por lo que este Instituto considera procedente el trámite de pago.

RFC emisor: OIJC760705GT4
Nombre emisor: Cristian Manuel Ortiz Jaquez
RFC receptor: TNM140723GFA
Nombre receptor: Tecnológico nacional de México/Instituto tecnológico de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D9A9-C33B-4DE4-85EC-DAC731247B9B
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 31105 2019-05-23 12:29:50
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
46161710		31	H87		590.00	18290.00			
Descripción	Lamparas de emergencia	?							
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado	18290.00	Tasa	16.0000%	2926.40	
			IVA	Retencion	18290.00	Tasa	16.0000%	2926.40	

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 18,290.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,926.40
Impuestos retenidos IVA \$ 2,926.40
Total \$ 18,290.00

Sello digital del CFDI:

S16uCBF9pyAlgoVGvUaJU+SEkmHTbw0XDmcdN3FGkh6G3zpmXLISTpfY9LXCyOE/4EGHXOLIw4h/Zhv3G6lyHDIL3gVK8t87s4!DFiHR2GhskQ4FeYMuFg1arZi01ffeTAfz/ZUS+LA8il45ROsozMSleZ32iLcUld5VvUP0LU8LzYN0nb7lgYf7FTESrvgwYbHLrEwy7ZmTXru6iWL0di98Ub87oGLv6PHMKJxsmOvKwxwbT15b4NuVx5xNIUvNFQkyeqoJQUz9gvpuKUEwK40/pKe2Y0NwTIABprr5sRbBAIdLGBL4bEFnf32RFcUD4ORgBhpCQSymbg==

Sello digital del SAT:

ajsLfljX+JA85cyhgDd1hpApKH0mvZr85tr8kzOJG77TUS09/6RtgucFWHBydnLVOql2bxe/Y1VW8ofPs9OSn//7raXA91cx1yrOUZkChNYC9vGG5AcoTDUJ/z5V3TQaKuRZmJVOlp90qemnmQOvaNIEYVN7w/5HdXXNwnLocExMO5yrdJlbOJEsu4XeYIRu/WBa2p7+tlldZQ181id2tT87kpwvDOX/45pYp2GIC7KLLBXaZgYFBRtok5cEDEWRVQ2YnQ0DKX1brE2GAU6T4auwEMW9M3MpeeshbrmnYyx9JZ35zz6le0vmZw5pCL7WGAJJCZlwvWJXGgJ+hw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D9A9-C33B-4DE4-85EC-DAC731247B9B|2019-05-23T12:32:56|SAT970701NN3|S16uCBF9pyAlgoVGvUaJU+SEkmHTbw0XDmcdN3FGkh6G3zpmXLISTpfY9LXCyOE/4EGHXOLIw4h/Zhv3G6lyHDIL3gVK8t87s4!DFiHR2GhskQ4FeYMuFg1arZi01ffeTAfz/ZUS+LA8il45ROsozMSleZ32iLcUld5VvUP0LU8LzYN0nb7lgYf7FTESrvgwYbHLrEwy7ZmTXru6iWL0di98Ub87oGLv6PHMKJxsmOvKwxwbT15b4NuVx5xNIUvNFQkyeqoJQUz9gvpuKUEwK40/pKe2Y0NwTIABprr5sRbBAIdLGBL4bEFnf32RFcUD4ORgBhpCQSymbg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23 12:32:56

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



Se recibió a entera satisfacción el bien, por lo que este Instituto considera procedente el trámite de pago.

RFC emisor: OIJG760705GT4
Nombre emisor: Cristian Manuel Ortiz Jaquez
RFC receptor: TNM140723GFA
Nombre receptor: Tecnológico nacional de México/Instituto tecnológico de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15500-D558-49C3-ACDB-8AEE61A56273
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 31105 2019-05-23 13:01:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102900		1	E48		5000.00	5000.00				
Descripción	Servicio de Instalacion de todo el equipo de alarma contra incendios (Extinguidores, detectores de humo, lamparas de emergencia, señalizadora, ET)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5000.00	Tasa	16.0000%	800.00
					IVA	Retencion	5000.00	Tasa	16.0000%	800.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 5,000.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 800.00
Impuestos retenidos IVA \$ 800.00
Total \$ 5,000.00

Sello digital del CFDI:

O4VpLZ/Bsjw41i8+Gnam/CFIEHJ3TMkLc6hdeLdo0LYVJsnLAloAIDE1ArOs0+SAj8WZ7z2rCIIFKBncSyAbUrdWi3lUXp8Alw1ES2qki0JBlpj8KMEoyT5NqWrvRoj4SGdk+L0IVb6ilBq416Un4vTMo+MI5UKULTHgMUio+X7jIA0LTJlL0LXNITklywmHJbH3nl91TPnCYZGj4hWlsjOlymsg5mngG5TJSJlT3Um7xSJ3Uz3jHvVoy8I00snVilk2InOBuFcPBaJ+ACUbe4ICf049UIE5tUGpmC
UOzsREfGiw21AwpBwnc9nQ7pgni9AzmEDrEpPSI2Q==

Sello digital del SAT:

FkMvZviORg/KmOfgeG2wGA53rwYRpw2T6v7ITiseADnaUIYWmSmCwmzkO6sfex84Q+cbv6bpuuJe+RwJBpW8K8ht+S0/ASH2TqGRJCmgP1QnsGcuD4aDy7qn6bNvNK8sbQZME5aKYN9NCL79Vs7U4odnvqWafs0w1tIQHUUWBrUyVxvQqHsyFqjZychaPwBcAihRndSpa9bDj1lJboBsljFk1nMyPoolY1EUpWv87PN2u9+0XsyCo6bOsl/ad9vtEdhpCpCDd5ePfcQnXYwQIncNm3jGleSw18bW2rimsJY+XstrW2i9ILKvWGeApVQDK+99eQpvHOTqIUj2+TBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15500-D558-49C3-ACDB-8AEE61A56273|2019-05-23T13:03:37|SAT970701NN3|O4VpLZ/Bsjw41i8+Gnam/CFIEHJ3TMkLc6hdeLdo0LYVJsnLAloAIDE1ArOs0+SAj8WZ7z2rCIIFKBncSyAbUrdWi3lUXp8Alw1ES2qki0JBlpj8KMEoyT5NqWrvRoj4SGdk+L0IVb6ilBq416Un4vTMo+MI5UKULTHgMUio+X7jIA0LTJlL0LXNITklywmHJbH3nl91TPnCYZGj4hWlsjOlymsg5mngG5TJSJlT3Um7xSJ3Uz3jHvVoy8I00snVilk2InOBuFcPBaJ+ACUbe4ICf049UIE5tUGpmCUOzsREfGiw21AwpBwnc9nQ7pgni9AzmEDrEpPSI2Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-23 13:03:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Se recibió a entera satisfacción el servicio, y
este Instituto considera procedente
el monto de pago.

RFC emisor: OIJC760705GT4
Nombre emisor: Cristian Manuel Ortiz Jaquez
RFC receptor: TNM140723GFA
Nombre receptor: Tecnológico nacional de México/Instituto tecnológico de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15D83-C08A-4B90-9558-DEE307211345
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 31105 2019-05-23 12:36:30
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
46191601		22	E48	Servicio	756.00	16632.00				
Descripción	Extintidor de PQS de 6 Kilos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16632.00	Tasa	16.0000%	2681.12
					IVA	Retención	16632.00	Tasa	16.0000%	2681.12
46191601		16	E48	Servicio	2900.00	46400.00				
Descripción	Extintidores de CO2 de 4.5 Kilos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	46400.00	Tasa	16.0000%	7424.00
					IVA	Retención	46400.00	Tasa	16.0000%	7424.00
46191601		9	E48	Servicio	2100.00	18900.00				
Descripción	Extintidores de CO2 de 2.5 Kilos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18900.00	Tasa	16.0000%	3024.00
					IVA	Retención	18900.00	Tasa	16.0000%	3024.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 81,932.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 13,109.12
Impuestos retenidos IVA \$ 13,109.12
Total \$ 81,932.00

Sello digital del CFDI:

JBcDNLp5BE/4U0fd/hAYf2HG0QyV8PMedSFSpna7R0BVRnnMHGAykBUzt7ZbTsKe8/aRXrHEJM4aCOTpn8crKH9gkgIQ4RZpBNrElrENLUnJpw6DyixEE9dkmIXGd5JclDtzs5KeZNumYHc7OBFGdd65B1fuMUcmkRLQhHohJO+TcY7TB9koMc4DpeTIISExmg3rk8IQNJAfk3sn/Wk59IAHvYbRfCNQ9ogkjmhER+I2/3yUZxuct+GL922d2I066lyKv1kZDcUWajykSDnKBCYbh8D+TSVs0JNdF6khNYo+/n2SVIECNyxnuB3arBgaUnQn7fwNfRGBckrbp2g==

Sello digital del SAT:

QBoLF28T54HMWDyMddcPhrQQ6oa1f+t6WwM9B3qIWxu5+z+L6uoAap7B4dnBDWag3OYMFgvntNz18nkOwdnorLqYD3E84MIOdpKCxovQlbO5CRP1EPz15xERH5R6o87FbNZc5MAde1rAoSxMrZ94F5vuZEI52jbs5Cr6vJ09/5QyEOqOXcoY7UZWXNbK4KkwdJgqIG/x9yMRMLEmMm80f9IPxPQVQlvt1ITXz2cooEUym+Uusb1rsxWeeMmlRSm+IL+GqPof4rxd6bvDonahyqf/QMje8gZWOp7g8/WgDZCCNdwr6XAJY7bCLKisxMm2nmHn2HQRH8ldJEunA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15D83-C08A-4B90-9558-DEE307211345|2019-05-23T12:57:04|SAT970701NN3|JBcDNLp5BE/4U0fd/hAYf2HG0QyV8PMedSFSpna7R0BVRnnMHGAykBUzt7ZbTsKe8/aRXrHEJM4aCOTpn8crKH9gkgIQ4RZpBNrElrENLUnJpw6DyixEE9dkmIXGd5JclDtzs5KeZNumYHc7OBFGdd65B1fuMUcmkRLQhHohJO+TcY7TB9koMc4DpeTIISExmg3rk8IQNJAfk3sn/Wk59IAHvYbRfCNQ9ogkjmhER+I2/3yUZxuct+GL922d2I066lyKv1kZDcUWajykSDnKBCYbh8D+TSVs0JNdF6khNYo+/n2SVIECNyxnuB3arBgaUnQn7fwNfRGBckrbp2g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23 12:57:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Se recibió a entera satisfacción el servicio, por lo que este Instituto considera procedente el límite de pago.

RFC emisor: OIJC760705GT4
Nombre emisor: Cristian Manuel Ortiz Jaquez
RFC receptor: TNM140723GFA
Nombre receptor: Tecnológico nacional de México/Instituto tecnológico de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E8E1-3F46-4BC7-A9DB-C517E5DC6CFD
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 31105 2019-05-23 12:33:16
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
60111000	h87	163	H87	Pieza	50.00	8150.00				
Descripción	Señalética contra incendios ?				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8150.00	Tasa	16.0000%	1304.00
					IVA	Retencion	8150.00	Tasa	16.0000%	1304.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,150.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,304.00
Impuestos retenidos IVA \$ 1,304.00
Total \$ 8,150.00

Sello digital del CFDI:

glghMSC/boHI5WFTL6EVOQMImFH50sqi+IL7U3tsoGNoY3GeOAIrSdcrIMfIsNwUuY6+kJI4fS/6kezudJJKpHIDRHkslbZ1ExL0aivOYQyuYsqNSQvJk3xCUMYuQJcSFN3Qgx5wBhbT13PBExw30UXe121DLSINVG061402IL14U87TUmMJZO++xAaX3IAEIUMYSzWIOT+cr/GIISdnrToZdpkx9huKbBEMCU6DkqyDjY/lfq8rpqD1xTZ9qSv5IEM0sI9aPpwAq4pn6o85hx1GmL70JPqkJ6DJJISVDejCh8ofUbaR593F15Ba+P5LYr+Ea5fQVWXfp9XQ==

Sello digital del SAT:

JHFa+kl86up6PeKI68gwfzvQcD8g4wft5pZnQ2Mxp04JqMs5y36M+2Wl/ektb8XNoue982RG50IkVI+W1yhISqzdPPh72k10KSO/y0gikbnyeAoF9Q6bw/w3/or9vU6DS4IQEUlyTbcSHdrUmlkXUKr9ko9lexEQYPmT13mCcAOIp6xBRmwWPKJ64J7FthwTGD0uwilgy41OC+OXnd9AoEIFxyGf5reXRZi9QcOpYBkJBMcyRxzgrHbJWbAjaTKJ1bslyT6rHeLJtN96ZCw193NTUQawLYb5DExUqIjsUuYHskba2eE5V2dcvichOSADmgsPKCm77/y6x9WQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E8E1-3F46-4BC7-A9DB-C517E5DC6CFD|2019-05-23T12:36:10|SAT970701NN3|glghMSC/boHI5WFTL6EVOQMImFH50sqi+IL7U3tsoGNoY3GeOAIrSdcrIMfIsNwUuY6+kJI4fS/6kezudJJKpHIDRHkslbZ1ExL0aivOYQyuYsqNSQvJk3xCUMYuQJcSFN3Qgx5wBhbT13PBExw30UXe121DLSINVG061402IL14U87TUmMJZO++xAaX3IAEIUMYSzWIOT+cr/GIISdnrToZdpkx9huKbBEMCU6DkqyDjY/lfq8rpqD1xTZ9qSv5IEM0sI9aPpwAq4pn6o85hx1GmL70JPqkJ6DJJISVDejCh8ofUbaR593F15Ba+P5LYr+Ea5fQVWXfp9XQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23 12:36:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Se recibió a entera satisfacción el bien, por lo que este Instituto considera procedente el trámite de pago.

PcSorias Centro de Computo

RFC emisor: BAFV681002AXO
 Nombre emisor: VICTOR ULICES BAEZA FLORES
 Folio: 201905061
 RFC receptor: TNM140723GFA
 Nombre receptor: Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chihuahua
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 54DAA142-07C7-453E-A625-344BBC528526
 No. de serie del CSD: 00001000000402657400
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31104 2019-05-06 09:30:34
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
81111803		1	ACT		389638.16	389638.16				
Descripción	Instalación de redes y puesta a punto de 276 nodos en dos edificios de Educación A Distancia consistentes en 3 plantas cada uno				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	389638.16	Tasa	16.0000%	62342.11
					IVA	Retención	389638.16	Tasa	16.0000%	62342.11

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: Contado

Subtotal \$ 389,638.16
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 62,342.11
 Impuestos retenidos IVA \$ 62,342.11
 Total \$ 389,638.16

Sello digital del CFDI:

qMLEBEA/KJHh3V7kmEcNqYnWQGG+563IZGOCMOebDSHd9o2hP+Mxm9fAUcYprFB8WmrkKM2NwSVQr5wK9JGdH1lkxD9wq/8emE5xwS/5/NQbS0S072SPLmE6jZ90NGVnAeM4p+vuVWxJmhZ+c7Qok4T4/GPKqj3cWkH1PB4g7nFbLzVlXoudOYVWqGagZd3qOIYFcBRbuJAmdFdmGPDZcSFHclR/pSmMnd1BZDR3frWmLpu1Zc93Prej0t10PvOG6duAo6EGEeqTLgs+cV9L+HETL5NkF7ICqHxI+Zg8hTKaRZQFf1KvYFcLZDuyFY5x9aApNDSQ0JoQ==

Sello digital del SAT:

Gr+KmD/InJ5pvWG9CW8STYwFdRw4p8I/CpnS7L6llWFT3IN8DmdaQ43loecJdsug0gVNIw0gCseVQPyeurB1Ljxj2H8iWl+qGy0JHxYRvh3V+6V8KyPVmykyLq8jXawzmOXef1E1ahG0dX2K8ePpj99wF8Y9JBn7KLA0S5NygOp/0W73EG4Cmr1fAZB7nYlz52qnpye6A77L3Zzc7GYRM4mPJMYD61a3PII83CXT6k+kUs1kaR+B3VanVICsoSJUdzdLhWemkY4WJGv6dFy8t5sd8c+HbL3UXJPKOZbizkZcl4NIICj0awkhO5Cby3/1qDVcjRyqX9v2BjGCA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54DAA142-07C7-453E-A625-344BBC528526|2019-05-06T09:43:44|SAT970701NN3|qMLEBEA/KJHh3V7kmEcNqYnWQGG+563IZGOCMOebDSHd9o2hP+Mxm9fAUcYprFB8WmrkKM2NwSVQr5wK9JGdH1lkxD9wq/8emE5xwS/5/NQbS0S072SPLmE6jZ90NGVnAeM4p+vuVWxJmhZ+c7Qok4T4/GPKqj3cWkH1PB4g7nFbLzVlXoudOYVWqGagZd3qOIYFcBRbuJAmdFdmGPDZcSFHclR/pSmMnd1BZDR3frWmLpu1Zc93Prej0t10PvOG6duAo6EGEeqTLgs+cV9L+HETL5NkF7ICqHxI+Zg8hTKaRZQFf1KvYFcLZDuyFY5x9aApNDSQ0JoQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-05-06 09:43:44

Se recibió a entera satisfacción el servicio, por lo que este Instituto considera procedente el trámite de pago.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO COMPLETO AV. TECNOLÓGICO No. 2809 Col. 10 DE MAYO
C.P. 31310 CHIHUAHUA, CHIH.

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
FECHA DE INICIO 6 1 2016
FECHA DE TERMINACIÓN 31 12 2019

FECHA DEL REPORTE
FECHA 1 8 2019
DÍA MES AÑO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM 2015	UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	30,000,000.00	0.00	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	95.44%	4510	4888	98%	LA OBRA ESTA INAUGURADA. EL RENDIMIENTO GENERADO ES DE \$2,315,625.76. MONTO COMPROMETIDO \$1,800,366.41
RENDIMIENTOS FAM 2015	EQUIPAMIENTO UNIDAD CENTRAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1,800,366.41	0.00	\$ 1,800,366.41	1,800,366.41	95.7%	4510	4888	95.7%	ESTAN POR ENTREGAR LOS ULTIMOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE :	VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
NOMBRE :		
CARGO :		
CORREO ELECTRÓNICO :		
TEL 10 DÍGITOS :		

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

----- Factura -----



Omar Duarte Hurtado
 (621) Incorporación Fiscal
 RFC DUHO880325EL8
 56a #2203, Rosario, Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31030
 Teléfono:
 Email: oduarte@sacai.com.mx

Fecha	07-06-2019
Folio interno	0000720629
Serie y Folio	FAC106

Sistemas Avanzados de Control de Acceso e Identificación

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	31030
Forma de pago	(02) Cheque nominativo
Método de pago	(PPD) Pago en parcialidades o diferido

FOLIO SAT

ab13e5f3-aac3-41df-a104-d8758919f1f9

Fecha emisión	12:21:27 07-06-2019
Fecha de certificación	12:21:30 07-06-2019
Certificado emisor	00001000000405227137
Certificado SAT	00001000000413990493

Receptor

Nombre	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
RFC	TNM140723GFA
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
72151703	ISA-001	1	E48	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA	17,000.00	0.00	17,000.00
Subtotal							\$ 17,000.00
Retenciones							
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 2,720.00
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 2,720.00
Total							\$ 17,000.00

Importe con letra ***** DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MXN *****



Sello digital de CFDI

TD9RB08f97ZCcB7EuJgFMJlIFP2D0almY7MN8wSZyDXL5/4XpKaYQT0asBS31bJnyOWPIbeI+nd5+R3c3cVnA9XD+4hPxHMVPRVAhlfzJVLKmm4Xra3mr01vgst3e0XJ2uKpIICSwcJaEzAZxeyPL0AU7EX74qVKi8/zeAU4BVt5Eq27phDDE+q4lhyDC5ypzleFEDmT6cT9mZmbqBQHgbg0K7d70hUILF0dx9HRgXZnRw/8plB4Nimle6gyLRo4IIB0M4rIE2RuZzVKLhMlc0RZtsF7xEwCGP4kuPicaa5D8glinJUf5QrovYyTxaQyFxCRB8yVxzhekW4h1w==

Sello SAT

Mo4Gah40uvUj/g+rdtnuNLpvDkWiP2ZzKlr9Bz9eg6Un72gnm3oZepVRay3QNNi9JCIHKKbBIQ5Oglzrj6vwlSxmuujnGHR7F0Qestog9IIB0H98ZZjflHvh5byE2D77eYVTIIP48LbX4UuZY3AaLkjbU0bU52HaOIIHkqJGloGbDQaIbHUoh5eN1I6/y9ev2VX+/ueXM8ZYaml/KzVh9aYPkQoKp4d4XIZmNpG3IN+6NfHmADzaVExzjNZMTPQA+9Rgn/ohW1rZlVg7XE/2ZlpzI2g0U0sINFCqP15r8g2RhCz5OFbq6+nA1cTqq2dillwAViuSnTIIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ab13e5f3-aac3-41df-a104-d8758919f1f9|2019-06-07T12:21:30|TD9RB08f97ZCcB7EuJgFMJlIFP2D0almY7MN8wSZyDXL5/4XpKaYQT0asBS31bJnyOWPIbeI+nd5+R3c3cVnA9XD+4hPxHMVPRVAhlfzJVLKmm4Xra3mr01vgst3e0XJ2uKpIICSwcJaEzAZxeyPL0AU7EX74qVKi8/zeAU4BVt5Eq27phDDE+q4lhyDC5ypzleFEDmT6cT9mZmbqBQHgbg0K7d70hUILF0dx9HRgXZnRw/8plB4Nimle6gyLRo4IIB0M4rIE2RuZzVKLhMlc0RZtsF7xEwCGP4kuPicaa5D8glinJUf5QrovYyTxaQyFxCRB8yVxzhekW4h1w==|00001000000413990493||

Factura



Omar Duarte Hurtado
 (821) Incorporación Fiscal
 RFC DUHO880325EL8
 56a #2203, Rosario, Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31030
 Teléfono:
 Email: oduarte@sacai.com.mx

Fecha	07-06-2019
Folio interno	0000720675
Serie y Folio	FAC107

Sistemas Avanzados de Control de Acceso e Identificación

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	31030
Forma de pago	(02) Cheque nominal
Método de pago	(PPD) Pago en parcialidades o diferido

FOLIO SAT

75eedfc2-7ba5-4d43-a981-8e570b411589

Fecha emisión	12:38:12 07-06-2019
Fecha de certificación	12:38:15 07-06-2019
Certificado emisor	00001000000405227137
Certificado SAT	00001000000413990493

Receptor

Nombre	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
RFC	TNM140723GFA
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
46171602	ESA-001	2	XKI	EQUIPO DE SISTEMA DE ALARMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, EL CUAL CONSISTE EN: 2 DISCOS DUROS PARA VIDEO VIGILANCIA 2TB WD20PURZ, CHAPA MAGNÉTICA, LECTOR DE CORTO ALCANCE, BOTÓN DE SALIDA SIN CONTACTO, TARJETA DE CONTROL, MONTAJE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO, 1 KIT PANEL DE ALARMAS, INCLUYE PANEL DE CONTROL VISTA, UN TECLADO, 1 GABINETE, METÁLICO, 1 SENSOR DE MOVIMIENTO, 2 CONTACTOS MAGNÉTICOS, 1 SIRENA DE 30 WATTS, 1 GABINETE METÁLICO PARA SIRENA DE 30 WATTS, 1 TRANSFORMADOR, 1 BATERÍA DE RESPALDO, 2 TAMPER PARA GABINETE, 1 COMUNICADOR IP Y UN AÑO DE SERVICIO TOTAL CONECT VISTA48EC-IP, 15 DETECTORES DE MOVIMIENTO 5800 PIR, CONTACTO MAGNÉTICO 5816, MODULO DE EXPANSIÓN CABLEADO DE 8 ZONAS 4219, TECLADO PROGRAMADOR.	28,948.04	0.00	57,896.08

Subtotal	\$ 57,896.08
Retenciones	
(002) IVA al 16.0000 %	\$ 9,263.37
Impuestos trasladados	
(002) IVA al 16.0000 %	\$ 9,263.37
Total	\$ 57,896.08

Importe con letra ***** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 MXN *****

----- Factura -----



Omar Duarte Hurtado
 (621) Incorporación Fiscal
 RFC DUHO880325EL8
 56a #2203, Rosario, Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31030
 Teléfono:
 Email: oduarte@sacal.com.mx

Fecha	07-06-2019
Folio interno	0000720600
Serie y Folio	FAC105

Sistemas Avanzados de Control de Acceso e Identificación

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso		
Moneda	MXN	Lugar de expedición	31030
Forma de pago	(02) Cheque nominativo		
Método de pago	(PPD) Pago en parcialidades o diferido		

Receptor

Nombre	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
RFC	TNM140723GFA
Uso de factura	(G03) Gastos en general

FOLIO SAT

8f61ad39-ede4-4e65-92a3-43d1de121b43

Fecha emisión	12:09:00 07-06-2019
Fecha de certificación	12:09:03 07-06-2019
Certificado emisor	00001000000405227137
Certificado SAT	00001000000413990493

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
46171610	CVD-01	2	XXI	DE 16 CÁMARAS DE VIDEO DIGITAL CADA UNO	15,369.47	0.00	30,738.94

Subtotal \$ 30,738.94

Retenciones

(002) IVA al 16.0000 % **\$ 4,918.23**

Impuestos trasladados

(002) IVA al 16.0000 % **\$ 4,918.23**

Total \$ 30,738.94

Importe con letra ***** TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 MXN *****



Sello digital de CFDI

SPfG8jDWhpNFfeOseAtwn3gOD7JUdyo5A8F5jBVLRIzPiOJSFqNLwD2Qwzsd6fUn8JMbO/KI7heSMYUhrbzhrBGbNR4rNlrBL/GDdeE37GXIWsnJaf1drhgJB+HpTPfHbmSn
 u7awd+QLKAKC2KrHFliuOazDZ9PG4R8K2lg/ocVycfufielm0BBzfFRMzrnwKqU3Ch++N9TH6ixOJvEba5pLc4fo0zqrS6qjXBkrfGky1UBMUrcPcm+bVzMC+lv2Fn4z4Y03P/Et
 hvxZnm4De6Wl0kG989DueB2vcuDJT8C6zp3KGm6wJ9FFCquXJD23lpQ2Fg6IRd4zckwXPTpg==

Sello SAT

EZwZTIFRj8B59qJoy1k7bGoxcQ1DbZUozHE7oMQ0H/8uxwGJRaxKSWMm6XrMdRKO0SzMp0QRG3BTU1/sf+fawxCaCOUIYIPWKKldXprzx4p1lm4J0K/BOsNPKpwcEkT
 ZpBRnSwexSjubGb45SvLwrE7zeoUxio/xPRI0whAXITnkG7KqLzZ0j9RM/jjhh10ZnEIYcVpNWUdml0x13kaiX0N5Yp8ZolXWcfWsjlkGGBU5Pve8Lf+xbz2BjeItg+Vo9ETOGvsV
 SgenG9JTs+j91IRVPQxRID1YcHkU3llymXVhzVEAxy9ld7Gzx36YOlvFLp/HIGER89vf153o2lpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8f61ad39-ede4-4e65-92a3-43d1de121b43|2019-06-07T12:09:03|SPfG8jDWhpNFfeOseAtwn3gOD7JUdyo5A8F5jBVLRIzPiOJSFqNLwD2Qwzsd6fUn8JMbO/KI7heSMYUhrbzhrBGbNR4rNlrBL/GDdeE37GXIWsnJaf1drhgJB+HpTPfHbmSn7awd+QLKAKC2KrHFliuOazDZ9PG4R8K2lg/ocVycfufielm0BBzfFRMzrnwKqU3Ch++N9TH6ixOJvEba5pLc4fo0zqrS6qjXBkrfGky1UBMUrcPcm+bVzMC+lv2Fn4z4Y03P/EthvxZnm4De6Wl0kG989DueB2vcuDJT8C6zp3KGm6wJ9FFCquXJD23lpQ2Fg6IRd4zckwXPTpg==|00001000000413990493||

----- Factura -----



Omar Duarte Hurtado
 (621) Incorporación Fiscal
 RFC DUHO880325EL8
 56a #2203, Rosarlo, Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31030
 Teléfono:
 Email: oduarte@sacai.com.mx

Fecha	12-06-2019
Folio interno	0000726672
Serie y Folio	FAC114

Sistemas Avanzados de Control de Acceso e Identificación

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	31030
Forma de pago	(02) Cheque nominativo
Método de pago	(PPD) Pago en parcialidades o diferido

FOLIO SAT

0fa74db0-5e61-41ae-8664-e222a127f1a7

Receptor

Nombre	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
RFC	TNM140723GFA
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Fecha emisión	13:31:06 12-06-2019
Fecha de certificación	13:31:15 12-06-2019
Certificado emisor	00001000000405227137
Certificado SAT	00001000000413990493

Concepto(s)

Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
43201618	RET-001	1	H87	RACK EMPOTRABLE, TRIPP LITE SRW 12USG SMART RACK U, RACK GABINETE DE PARED CON BISAGRA Y PUERTA DE ACRILICO, PROFUNDIDAD STANDARD DEL SWITCH.	10,000.00	0.00	10,000.00
39121640	UPR-001	1	H87	UPS PARA RACK, MODELO: TRIPP LITE SMART 1200L CD UPS/No. BREAK SMARTPRO 1200 VA 700 W, 120V AVR, 2U PARA RACK/TORRE LCD, USB, SERIAL D89, RJ45, 8 CONTACTOS	6,000.00	0.00	6,000.00

Subtotal \$ 16,000.00

Retenciones

(002) IVA al 16.0000 % \$ 2,560.00

Impuestos trasladados

(002) IVA al 16.0000 % \$ 2,560.00

Total \$ 16,000.00

Importe con letra ***** DIECISEIS MIL PESOS 00/100 MXN *****



Sello digital de CFDI

gJ0435EgJydlVldlel8uH04EOxVc5jcG119s86zixMbRbu0CdzoQX2YwepkbygluePwGTWpA+grszwkQyI/worX4C1UCz7JKb6g0ImDPGbyJTGTSPSVDbH2g3YHA/AB3FcoFF0B1Y8GO57J1E/Tnn2Vg305s1bYRpsKwV26qr7lgklQZPdHVgJapYRckXPs2h+eID3eJ+YSqHE0QghOxTp1cBmVkkBMFWXkO3BUc5+fp+sqQouZSfmvU4ITJoUjvrL2cTi3eB12I2WqlkeXJRrBLhr8zMT9S+DdOhxqHAODnh6ckHYPzezQlmaQdOHRpU80P7YvhGmQlrzleQMg==

Sello SAT

DriN0EWmC5hQGB0AhsZvGOu9XkgLfkseVR/ngOhHEeLhYTYZITyoUat+HC/6EaUyoWgMNoWl88VoMAxUY8yF0Jh59MCP05qyO5rR9NGd0zQXtq66vVxYUCCrwuClkbBPu4omxLJGW5+pmKpntgn9rBeV612oz1+XNOGUdaNv72chZRIDOCntB4JachHltoQMf9zfl/+/SsuDVRVY6sX19hTuUuKb2KCHo72n6crX/mB7/IVDWIZvO66H+PK9S3kqmxphButq/teIXCZ22Hg9JT9P9J4fHoQ0hnbBpSudrZQlICfVU0p5YoQWQZAonT+ZMBG9qgeqEM2I4BOI8BQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0fa74db0-5e61-41ae-8664-e222a127f1a7|2019-06-12T13:31:15|gJ0435EgJydlVldlel8uH04EOxVc5jcG119s86zixMbRbu0CdzoQX2YwepkbygluePwGTWpA+grszwkQyI/worX4C1UCz7JKb6g0ImDPGbyJTGTSPSVDbH2g3YHA/AB3FcoFF0B1Y8GO57J1E/Tnn2Vg305s1bYRpsKwV26qr7lgklQZPdHVgJapYRckXPs2h+eID3eJ+YSqHE0QghOxTp1cBmVkkBMFWXkO3BUc5+fp+sqQouZSfmvU4ITJoUjvrL2cTi3eB12I2WqlkeXJRrBLhr8zMT9S+DdOhxqHAODnh6ckHYPzezQlmaQdOHRpU80P7YvhGmQlrzleQMg=|00001000000413990493||

----- Factura -----



Omar Duarte Hurtado
 (621) Incorporación Fiscal
 RFC DUHO880325EL8
 56a #2203, Rosario, Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31030
 Teléfono:
 Email: oduarte@sacai.com.mx

Fecha	13-06-2019
Folio interno	0000728250
Serie y Folio	FAC115

Sistemas Avanzados de Control de Acceso e Identificación

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	31030
Forma de pago	(02) Cheque nominativo
Método de pago	(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Receptor

Nombre	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
RFC	TNM140723GFA
Uso de factura	(G03) Gastos en general

FOLIO SAT

51a46d43-9785-4ed0-a0bb-3e87f865b4a8

Fecha emisión	13:28:57 13-06-2019
Fecha de certificación	13:29:04 13-06-2019
Certificado emisor	00001000000405227137
Certificado SAT	00001000000413990493

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
39122205	SWD-001	1	H87	SWITCH DEVICE TYPE SWITCH, 1 G, 24 PORTS, ENCLOSURE TYPE RACK MOUNTABLE, 1 RU, PORTS 24X10/100/1000, 2X10 GE COPPER, 2X10 GE SFP+, PERFORMANCE 128 GBPS SWITCHING CAPACITY, 96.23-MPPS, FORWARDING PERFORMANCE, (64-BYTE PACKET SIZE) MAC ADDRESS TABLE SIZE 8K ENTRIES, CAPACITY 256ACTIVE VLANS, REMOTE MANAGEMENT PROTOCOL SNMP, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, TELNET, SSH, FEATURES, LAYER 2 SWITCHING LAYER, 3 SWITCHING, DHCP SUPPORT, BOOTP SUPPORT, VLAN SUPPORT, IGMP SNOOPING, SYSLOG SUPPORT PORT MIRRORING, DIFFSERV SUPPORT, WEIGHTED ROUND ROBIN (WRR) QUEUING, BROADCAST, STORM CONTROL, IPV6 SUPPORT, MULTICAST STORM CONTROL, SNTP SUPPORT, SPANNING, TREE PROTOCOL (STP) SUPPORT. RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RTSP), MULTIPLE SPANNING TREE (MSTP) TREE (MSTP), TRIVIAL FILE TRANSFER PROTOCOL (TFTP) SUPPORT, ACCES CONTROL LIST (ACL) SUPPORT, QUALITY OF SERVICE (QOS), JUMBO FRAMES SUPORT, MLD SNOPPING, SNMP	25,000.00	0.00	25,000.00

Subtotal	\$ 25,000.00
Retenciones	
(002) IVA al 16.0000 %	\$ 4,000.00
Impuestos trasladados	
(002) IVA al 16.0000 %	\$ 4,000.00
Total	\$ 25,000.00

----- Factura -----



Omar Duarte Hurtado
 (621) Incorporación Fiscal
 RFC DUHO880325EL8
 56a #2203, Rosario, Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31030
 Teléfono:
 Email: oduarte@sacai.com.mx

Fecha	12-06-2019
Folio interno	0000726637
Serie y Folio	FAC111

Sistemas Avanzados de Control de Acceso e Identificación

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	31030
Forma de pago	(02) Cheque nominativo
Método de pago	(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Receptor

Nombre	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
RFC	TNM140723GFA
Uso de factura	(G03) Gastos en general

FOLIO SAT

584f8a5b-4318-4775-b982-fcb7bce72db9

Fecha emisión	13:10:20 12-06-2019
Fecha de certificación	13:10:28 12-06-2019
Certificado emisor	00001000000405227137
Certificado SAT	00001000000413990493

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
46171610	CDS-001	1	H87	CAMARA DE SEGURIDAD. RING 88FLOOCH000, MOTION-ACTIVATED HD SECURITY	6,000.00	0.00	6,000.00
46171610	CPF-001	1	H87	CAMARA PARA FACHADA Y LABORATORIO, NEXT-CAM OUTDOOR SECURITY CAMERA 1080P HD WHITE	5,000.00	0.00	5,000.00

Subtotal \$ 11,000.00

Retenciones

(002) IVA al 16.0000 % \$ 1,760.00

Impuestos trasladados

(002) IVA al 16.0000 % \$ 1,760.00

Total \$ 11,000.00

Importe con letra ***** ONCE MIL PESOS 00/100 MXN *****



Sello digital de CFDI

JShASrzJE7ITHghn/0nULkfdwfpLrguLwHrkjv+IXYpaVFaCa3mD8EiYbSKJeBaMu/17X9IKfoFx7BPGucXFYod6OgTxAOEqmV12AomVOn4RYcbPXuyReWdvXyFZNhhrdwUWCKD0PIY7zQ27xG+KPWVhDk/Ly3ZPpQIBPgJq+IE3nqtlW3EsGQGR+Bb7KXJc8xdg2h0K+vY/q1C1YATxPmncdGVt636OHkhTJk2nznILRkbOBkhuFgZr+H4ZERw6Fzsyn3IAGokavMD1eXBKMNqadrQKOs/udwLLySqtjxHlPvzkJ0gaje122vmhW5/gTLDCC2ad7Hl/qJA==

Sello SAT

SzEklwyGkuXEUjz+6IZEQZjnZtBKcWG4cdRigzf3Uqnh9V8K706v22aaNSoSF18UyaKW6NymLNTGT+6VeRgGxJCH+S82CCBXV3cm8KzEbgzNODIUNXE49RAqwnlJYgzYXUjD61+qVheCEQAqh8f0fzkX7oXnWFSmmHB/0B2Y1aRRYLJGHKGrJAQJmkt+TYRpmLI98+WuWyqR/1exNjPnHXoMgdWVerbp2GgYEPH2405BYky2e/mxSAYp7OOFDmEVQ10UaJQyQo27cEcF5Qs9IRAbnZCa7uz7QmuAK52bcYrYddP97rhtgEJ0MxnmNAnMm+pDj8QnpvpsXwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||584f8a5b-4318-4775-b982-fcb7bce72db9|2019-06-12T13:10:28|JShASrzJE7ITHghn/0nULkfdwfpLrguLwHrkjv+IXYpaVFaCa3mD8EiYbSKJeBaMu/17X9IKfoFx7BPGucXFYod6OgTxAOEqmV12AomVOn4RYcbPXuyReWdvXyFZNhhrdwUWCKD0PIY7zQ27xG+KPWVhDk/Ly3ZPpQIBPgJq+IE3nqtlW3EsGQGR+Bb7KXJc8xdg2h0K+vY/q1C1YATxPmncdGVt636OHkhTJk2nznILRkbOBkhuFgZr+H4ZERw6Fzsyn3IAGokavMD1eXBKMNqadrQKOs/udwLLySqtjxHlPvzkJ0gaje122vmhW5/gTLDCC2ad7Hl/qJA==|00001000000413990493||

----- Factura -----



Omar Duarte Hurtado
 (621) Incorporación Fiscal
 RFC DUHO880325EL8
 56a #2203, Rosario, Chihuahua, Chihuahua, México
 C.P. 31030
 Teléfono:
 Email: oduarte@sacai.com.mx

Fecha	12-06-2019
Folio interno	0000726654
Serie y Folio	FAC113

Sistemas Avanzados de Control de Acceso e Identificación

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	31030
Forma de pago	(02) Cheque nominativo
Método de pago	(PPD) Pago en parcelas o diferido

Receptor

Nombre	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
RFC	TNM140723GFA
Uso de factura	(G03) Gastos en general

FOLIO SAT

b2ac4eda-1366-4ea0-9e83-614d0ed4802c

Fecha emisión	13:19:21 12-06-2019
Fecha de certificación	13:19:26 12-06-2019
Certificado emisor	00001000000405227137
Certificado SAT	00001000000413990493

Concepto(s)

Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
39111600	BEL-001	8	H87	BASES EMPOTRABLES LUCES, TECNOLITE YD-1200/B LUMINARIO EMPOTRADO, COLOR BLANCO	200.00	0.00	1,600.00

Subtotal \$ 1,600.00

Retenciones

(002) IVA al 16.0000 % \$ 256.00

Impuestos trasladados

(002) IVA al 16.0000 % \$ 256.00

Total \$ 1,600.00

Importe con letra ***** UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN *****



Sello digital de CFDI

ZgLF7GMM0750saFi6Qj8mDAdTzSINVAfCQoSYFRzWlw58Uit0+cYhXTU/2MNj0dc89SE0RLNWYAWd8hqICFXCFBEuG82kMfH9rK2G2/kKC90CO8mAdsCM2je7W8e7I8wob38s8S+kGU7W9bDCc7q8pp/WPUInpKIhe6JgrBfAI2gR+JWHedIFeul++sWWW+H0F131YyhCg9vqllKIY5Dx5k7voR0HN4IClUw0ejMdKD8wDczYNM//4MKBK7zLiCYBSSmRfDc8pPiHzFvfpysZrWchN0cNddOw4jVS8vYgJjSjNyWgcR3nuniB0znOhY2y9IX0tpSPV+vjrvm+QksQQ==

Sello SAT

KV1JubNYAJZxv800dfgqb8luM9u3RRSsKNf6BxeZMbsCsFWVFKwEPoUKpWTLRZJrY763CbWmuXcoGPO78ILCU0mg6MK0y+YVHJxKwYMuHm3xO95eEOFH1y88Om3OF8LJGTvsl6IMPR7jeyves7kXS8qVVAJStm5MQ6U3OVn8lz3+10XpcxzCnuv9whg9kX3swj119EIQ9aP7DaSFD74rIn6u0WTUP7xIY+bSO0NbfCcGwa+zQf3IXzPWXC3ZA hKLcmxOEmlG41I8BGNOvGB2UO6f3vQzRYnC6YA03o4E2PAVsvJUMrKA+yW2/RHxBlrKamuV8Nlg1+gQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b2ac4eda-1366-4ea0-9e83-614d0ed4802c|2019-06-12T13:19:26|ZgLF7GMM0750saFi6Qj8mDAdTzSINVAfCQoSYFRzWlw58Uit0+cYhXTU/2MNj0dc89SE0RLNWYAWd8hqICFXCFBEuG82kMfH9rK2G2/kKC90CO8mAdsCM2je7W8e7I8wob38s8S+kGU7W9bDCc7q8pp/WPUInpKIhe6JgrBfAI2gR+JWHedIFeul++sWWW+H0F131YyhCg9vqllKIY5Dx5k7voR0HN4IClUw0ejMdKD8wDczYNM//4MKBK7zLiCYBSSmRfDc8pPiHzFvfpysZrWchN0cNddOw4jVS8vYgJjSjNyWgcR3nuniB0znOhY2y9IX0tpSPV+vjrvm+QksQQ=||00001000000413990493||
